


現況(S=1:2000)



第2期整備工事イメージ

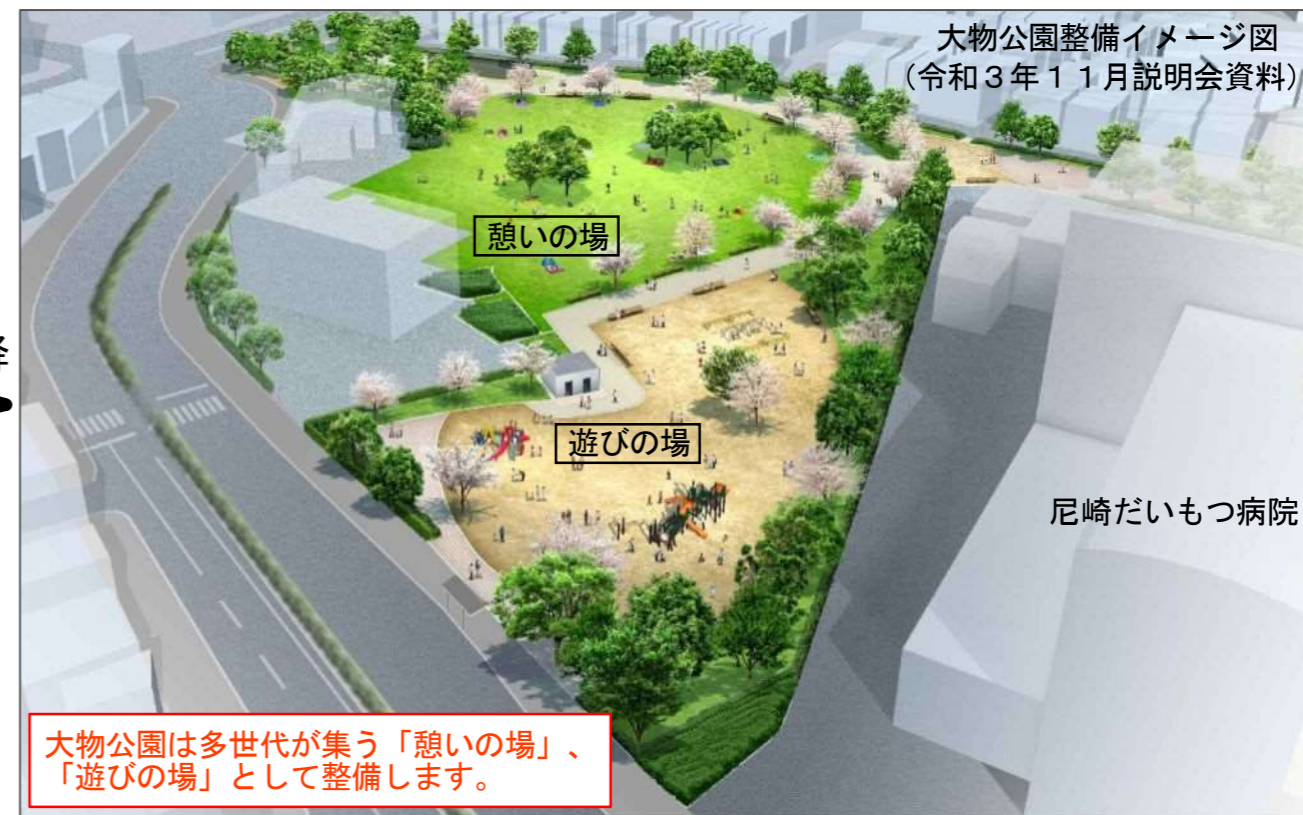


令和7年度以降

大物公園は多世代が集う「憩いの場」、「遊びの場」として整備します。

※今回の工事

第1期整備工事後(S=1:2000)

第1期整備工事により広場機能を確保  
(樹木の撤去や敷地造成を行います)

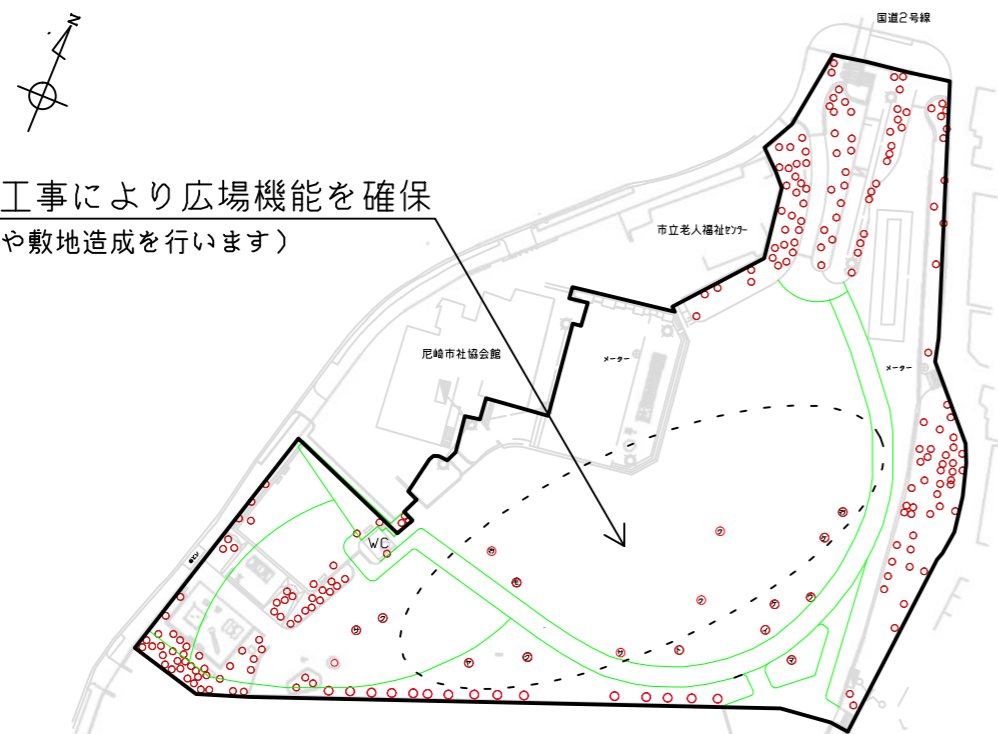

○ 撤去せずに残置する樹木  
— 第2期整備工事イメージに基づく園路等計画ライン

○小田南公園および周辺施設整備に係る全体スケジュール

取組項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
大物公園第1期整備工事	←→			
琴ノ浦高等学校グラウンド利用		←→	←→	←→
小田南公園整備工事		←→	←→	
大物川緑地、道路の整備 (観客の主要動線)		←→	←→	
小田南公園の供用開始 (令和7年2月)				←→
大物公園第2期整備工事 大物川緑地とその周辺道路の整備				←→
東部雨水ポンプ場 多目的運動広場の整備				令和11年度以降

## 大物公園第1期整備工事の工事概要について

### ○工事の目的

小田南公園の整備に伴い、令和5年1月から令和7年1月末までの約2年間小田南公園を閉鎖することで現状の多目的広場を利用できなくなることから、その代替として大物公園に広場機能を確保することを目的に第1期整備工事を施工します。

### ○工事の時期

令和4年8月下旬～令和4年12月下旬（約4ヶ月間）

※土、日、祝日は原則休工ですが、工事の進捗によっては作業する場合があります。

### ○作業時間

午前9時から午後5時まで ※午前8時30分から朝礼等を始めます。

### ○工事内容

#### ・植樹帯（樹木）の撤去

公園中央部の日本列島をモチーフにした植樹帯の石や土砂、また樹木の撤去を行いダンプトラックで公園外へ搬出します。公園外周の樹木のうち、一部、腐食が進んだ危険木についても合わせて撤去します。

#### ・整地作業

植樹帯（樹木）の撤去完了後、段差を無くすための整地作業を行います。

※工事中は、高さ1.8mの工事フェンスで作業範囲を仮囲いします。

### ○施工業者

株式会社 今里三合園      現場代理人：打田 拓也  
連絡先：06-6436-3500

### ○工事車両の動線

大物線から社協会館の駐車場を通り大物公園へ進入します。大物公園東側の南北道路（南行一方通行）は、原則、利用する予定はありません。

### ○工事車両の台数

撤去樹木や土の搬出のため、1日に約5台の工事車両の出入りを予定しています。

### ○工事の騒音対策

撤去した樹木を小切り（短く切断）する作業は、出来る限り住宅から離れた場所で行います。また、騒音や粉じん飛散の軽減を目的として、東面と南面の工事フェンスにシートを設置します。

### ○その他

- ・工事車両の公園内への進入や通行の際は、徐行のうえ交通誘導員の誘導に従います。
- ・工事範囲以外の部分は、右図のとおり工事期間中も通り抜けが可能です。
- ・予定の工事期間より早く工事が完成した場合には、前倒しで開放いたします。

### ○工事概要図

