阪急電鉄神戸線
武庫之荘～西宮北口駅間新駅設置事業

工事説明会

2026年9月25日･26日

阪　急　電　鉄　株　式　会　社


説明内容

§1. 事業の概要
§2. 工事内容・手順
§3. 工事車両の運行及び安全対策
§4. 周辺環境対策
§5. 作業日・作業時間帯
§6. 現場事務所の設置
§7. お問い合わせ先
§8. 完成イメージパース

§1.事業の概要

事業の概要（その１）

新駅計画位置

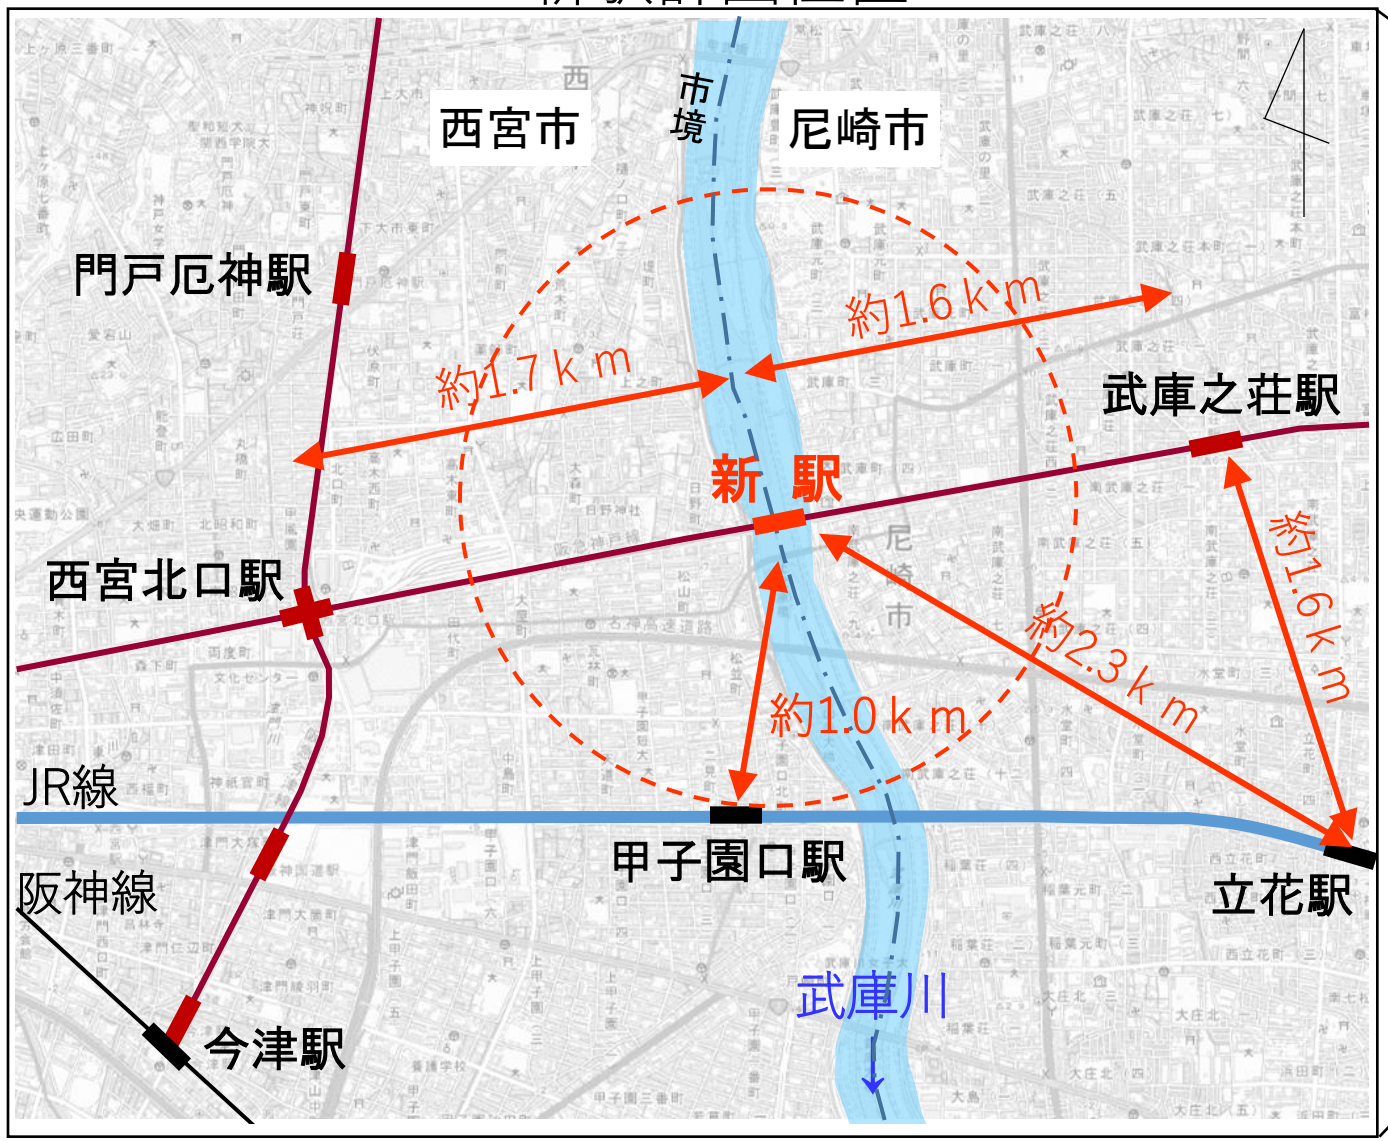





武庫川上空から見た新駅計画位置


事業の概要（その2）



大阪梅田方面


神戸三宮方面

事業の概要（その3）

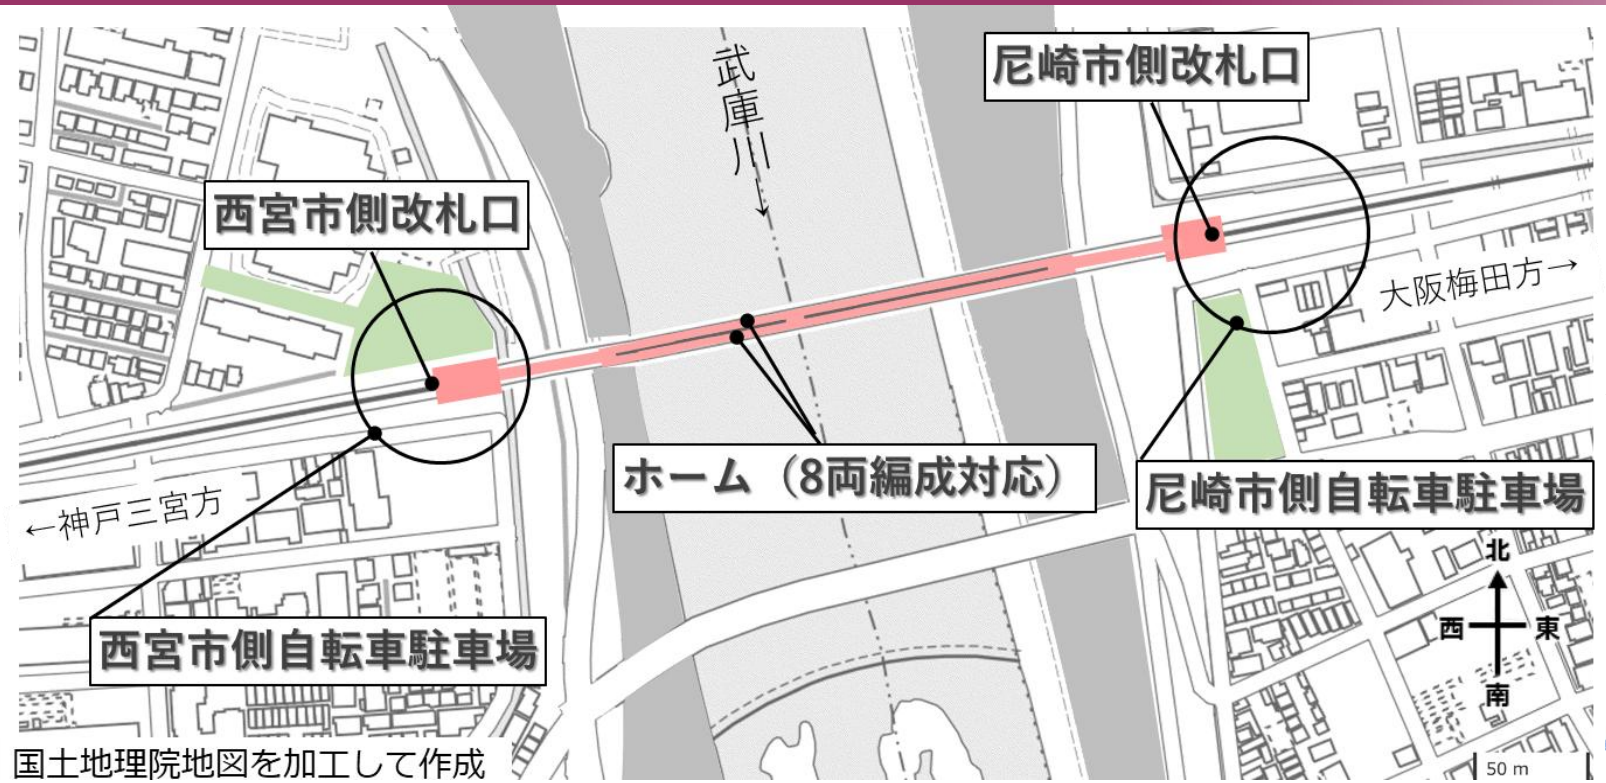

国土地理院地図を加工して作成

ホーム区間断面図

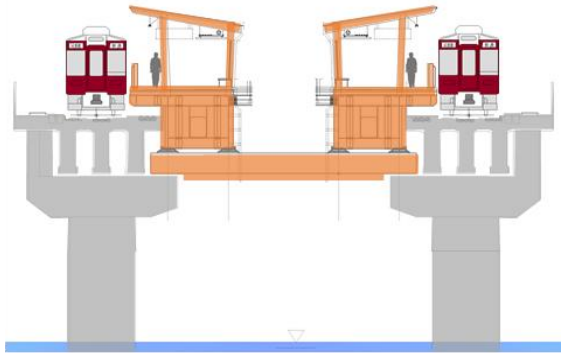


新駅の仕様

・上下線各ホーム（８両編成対応）、西宮市側改札口、尼崎市側改札口、可動式ホーム柵、昇降機（エレベーター・エスカレーター）、旅客トイレ等の駅舎施設・設備等

・西宮市側自転車駐車場、尼崎市側自転車駐車場等

事業スケジュール

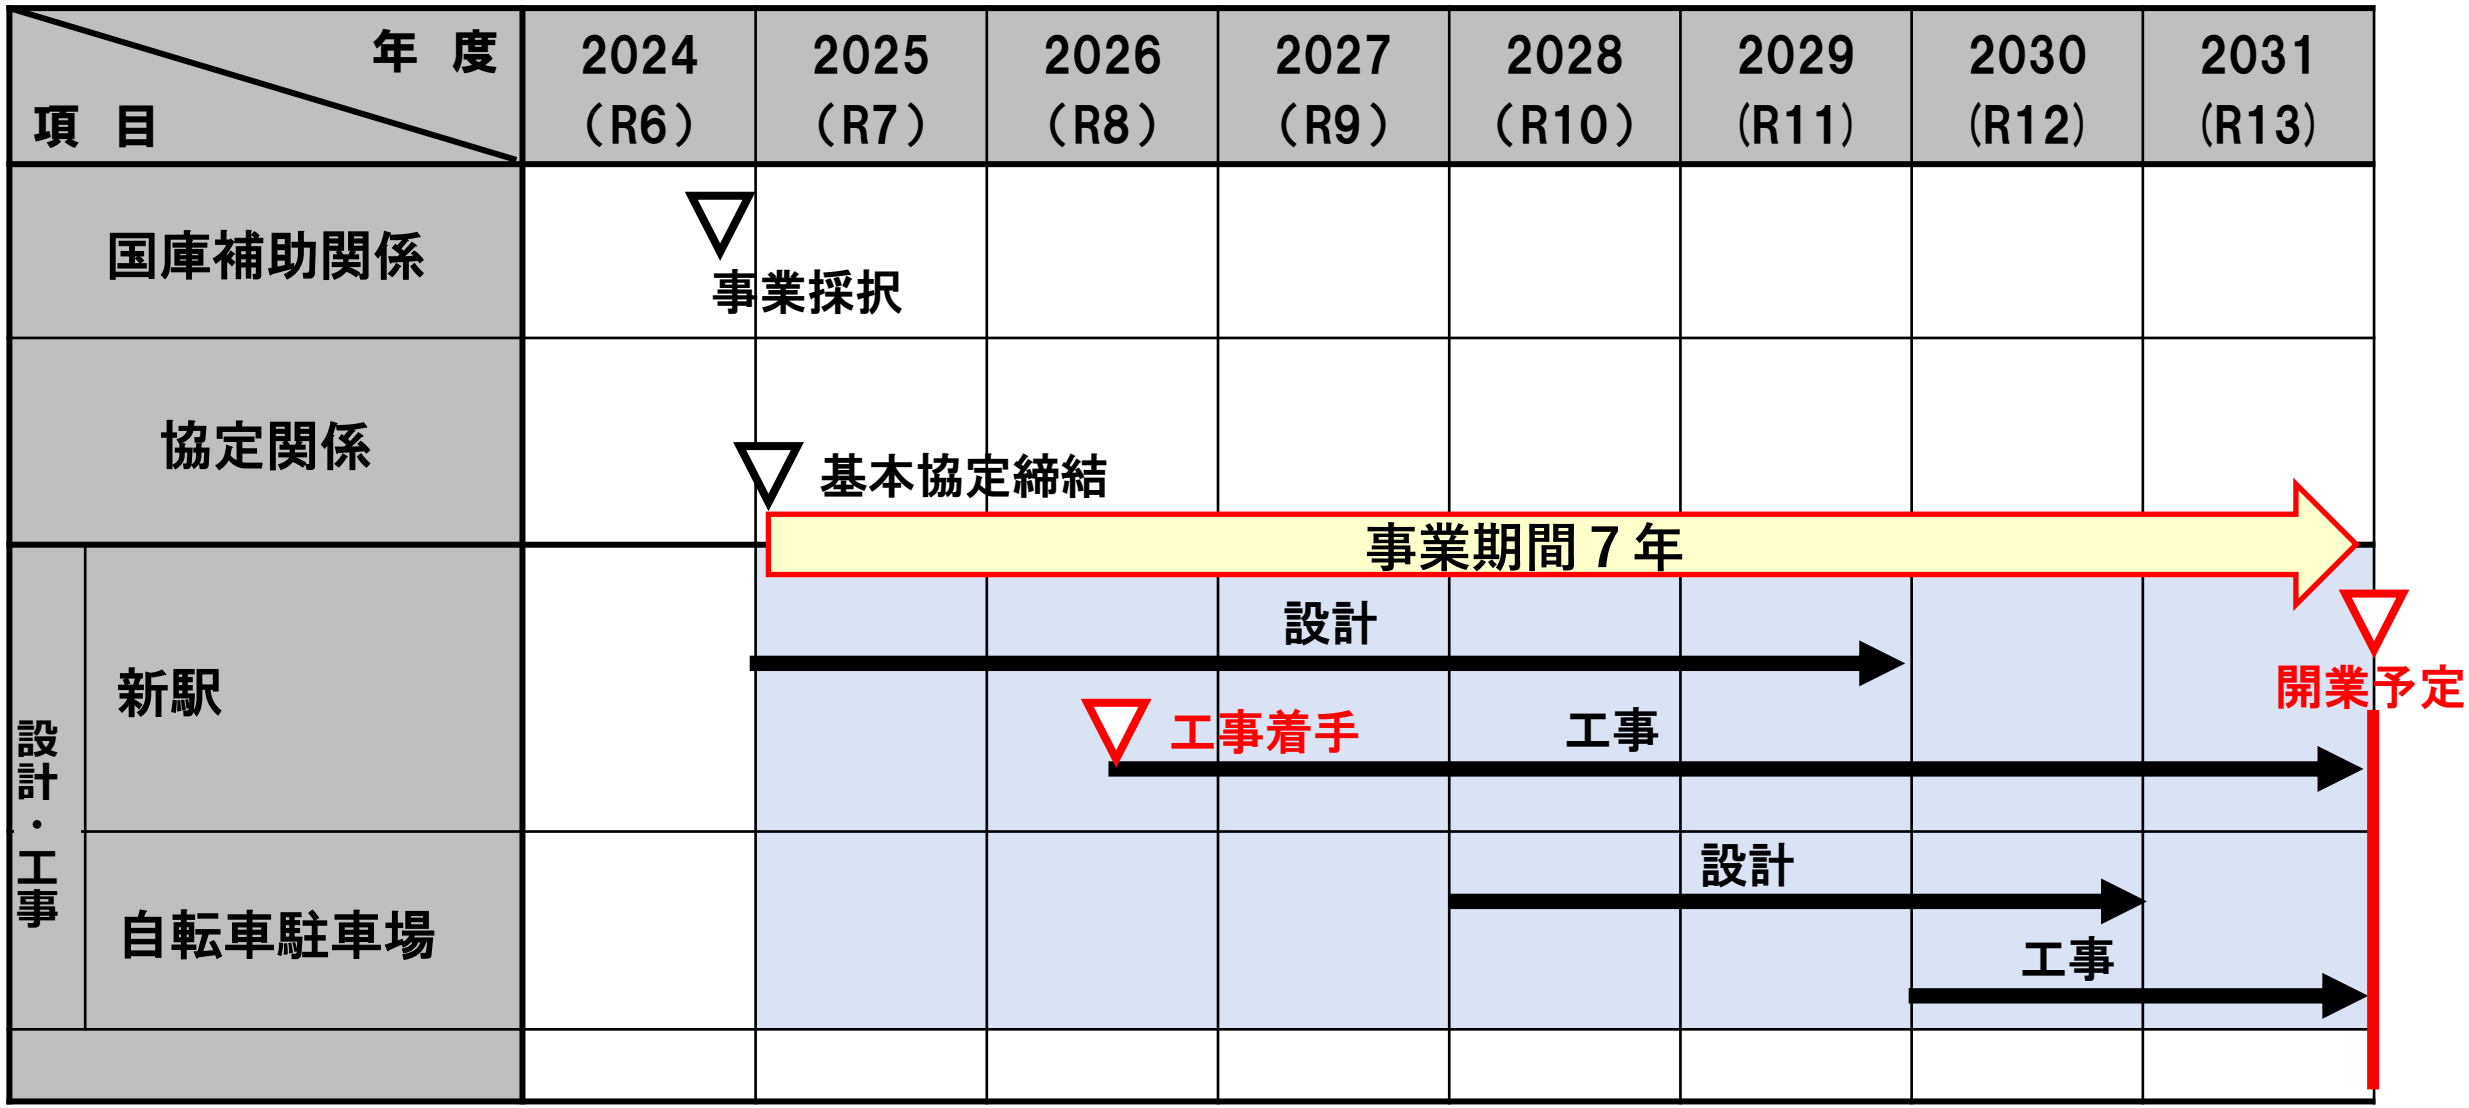
年度
項目
2024（R6）
2025（R7）
2026（R8）
2027（R9）
2028（R10）
2029（R11）
2030（R12）
2031（R13）
国庫補助関係
事業採択
協定関係
基本協定締結
事業期間７年
設計・工事
新駅
設計
工事着手
工事
開業予定
自転車駐車場
設計
工事

§2.工事内容・手順

工事の流れ

STEP1

準備工事

◇河川内ヤード
◇工事用ヤード　整備工事

STEP2

橋桁工事


◇ホーム・連絡通路　橋桁工事
◇ホーム受梁工事
◇橋台（基礎）工事

STEP3

駅施設・設備工事

◇エレベーター・エスカレーター工事
◇駅舎・ホーム工事


STEP1　準備工事（ヤード整備）

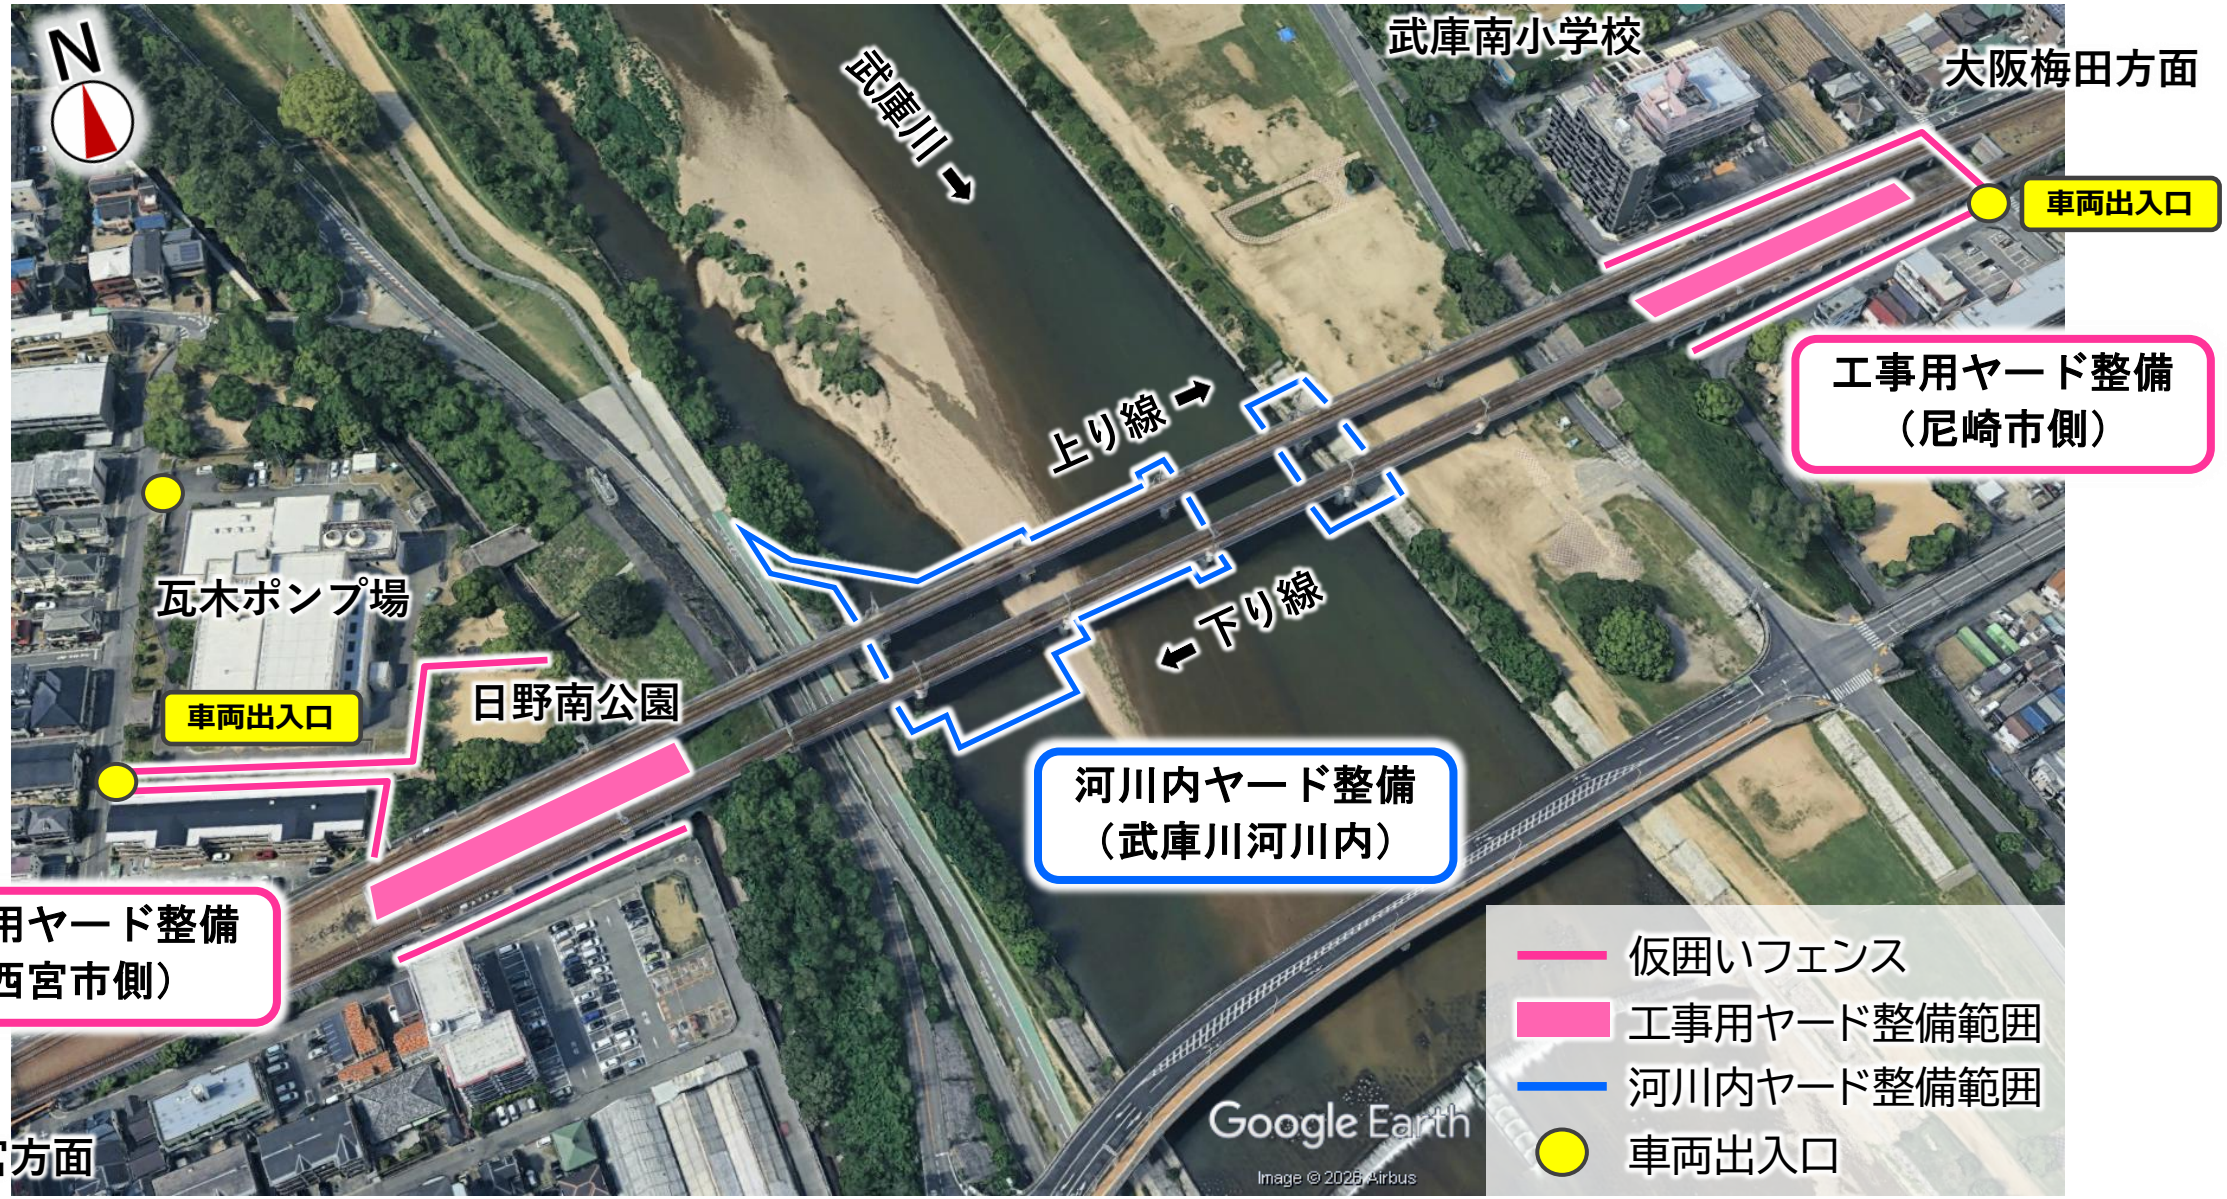


主な工事内容

武庫川左岸（尼崎市側）

STEP1 準備工事　◇仮囲いフェンスの設置及び施工ヤード整備について

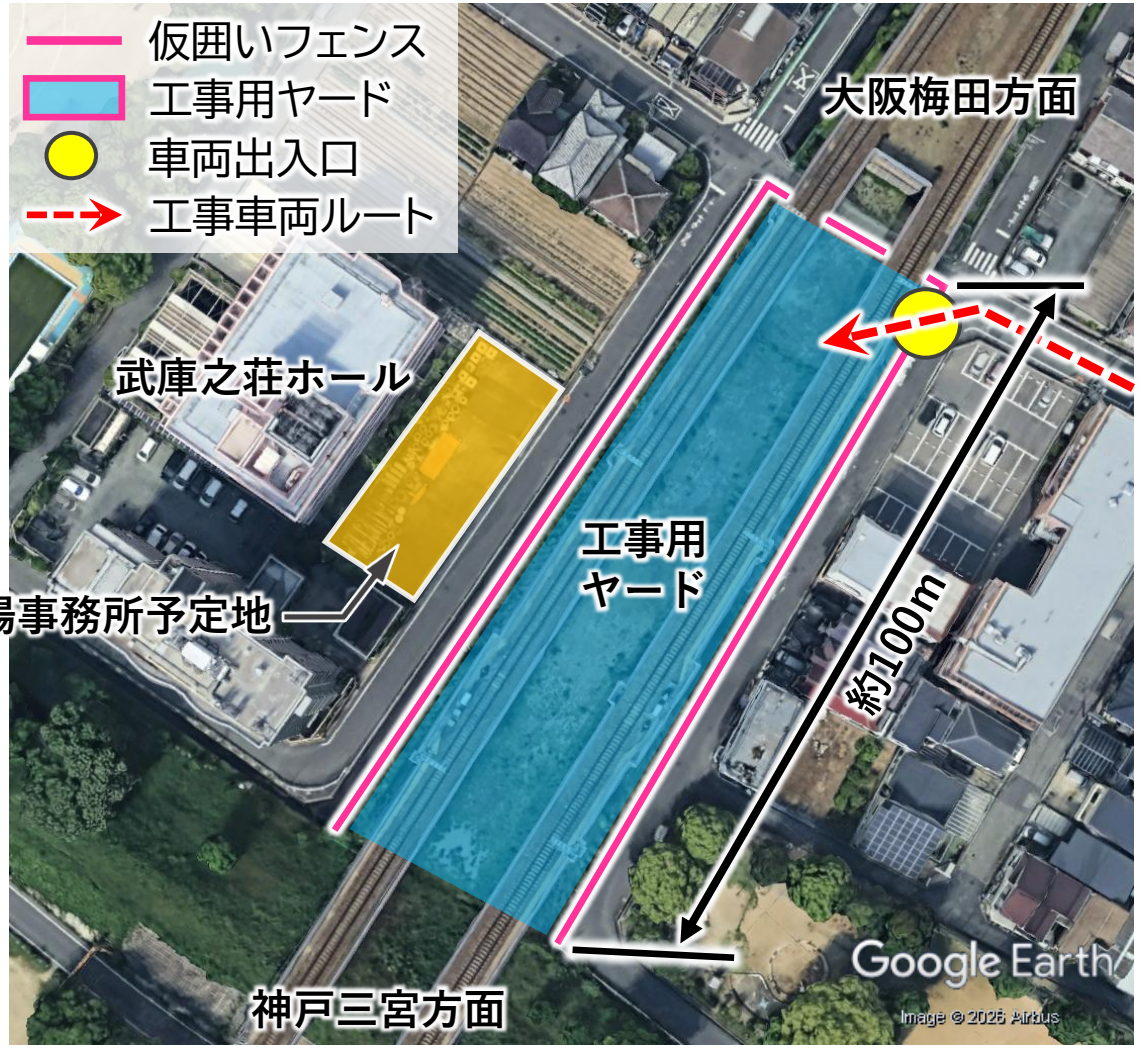

尼崎市道守部区画第6号線

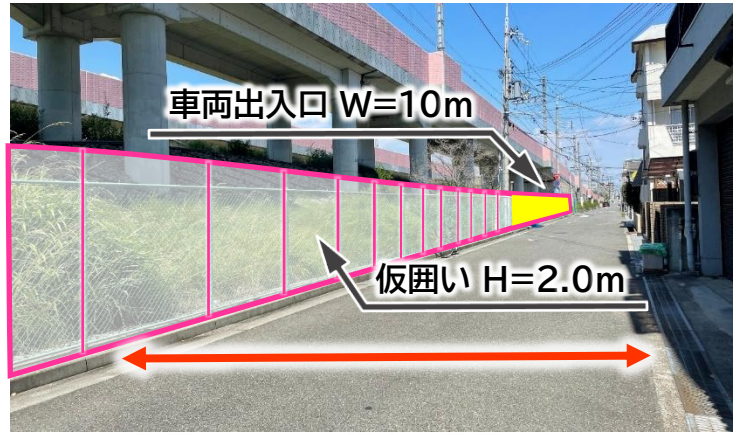

仮囲いフェンス設置イメージ




既設フェンスを撤去後設置します。
現状の幅員に影響はございません。





主な工事内容

STEP1　準備工事　◇河川内ヤードの整備について（武庫川河川内）

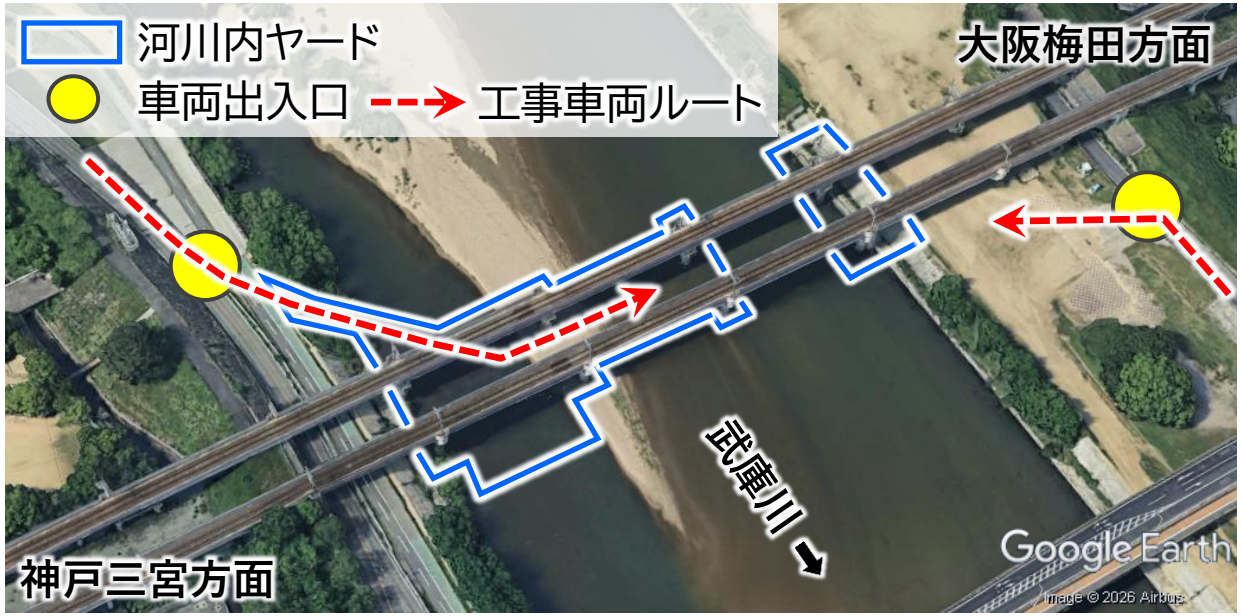



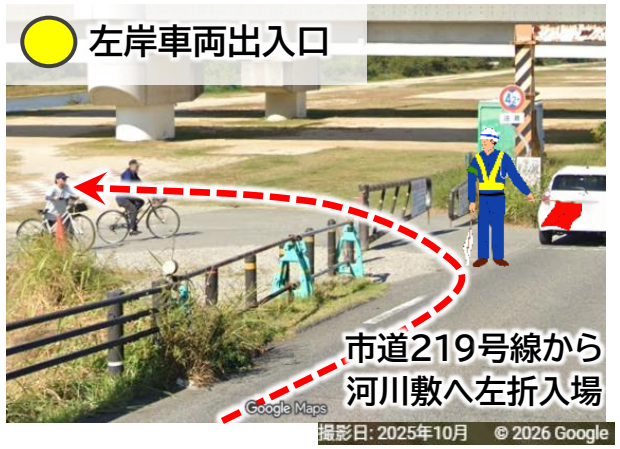

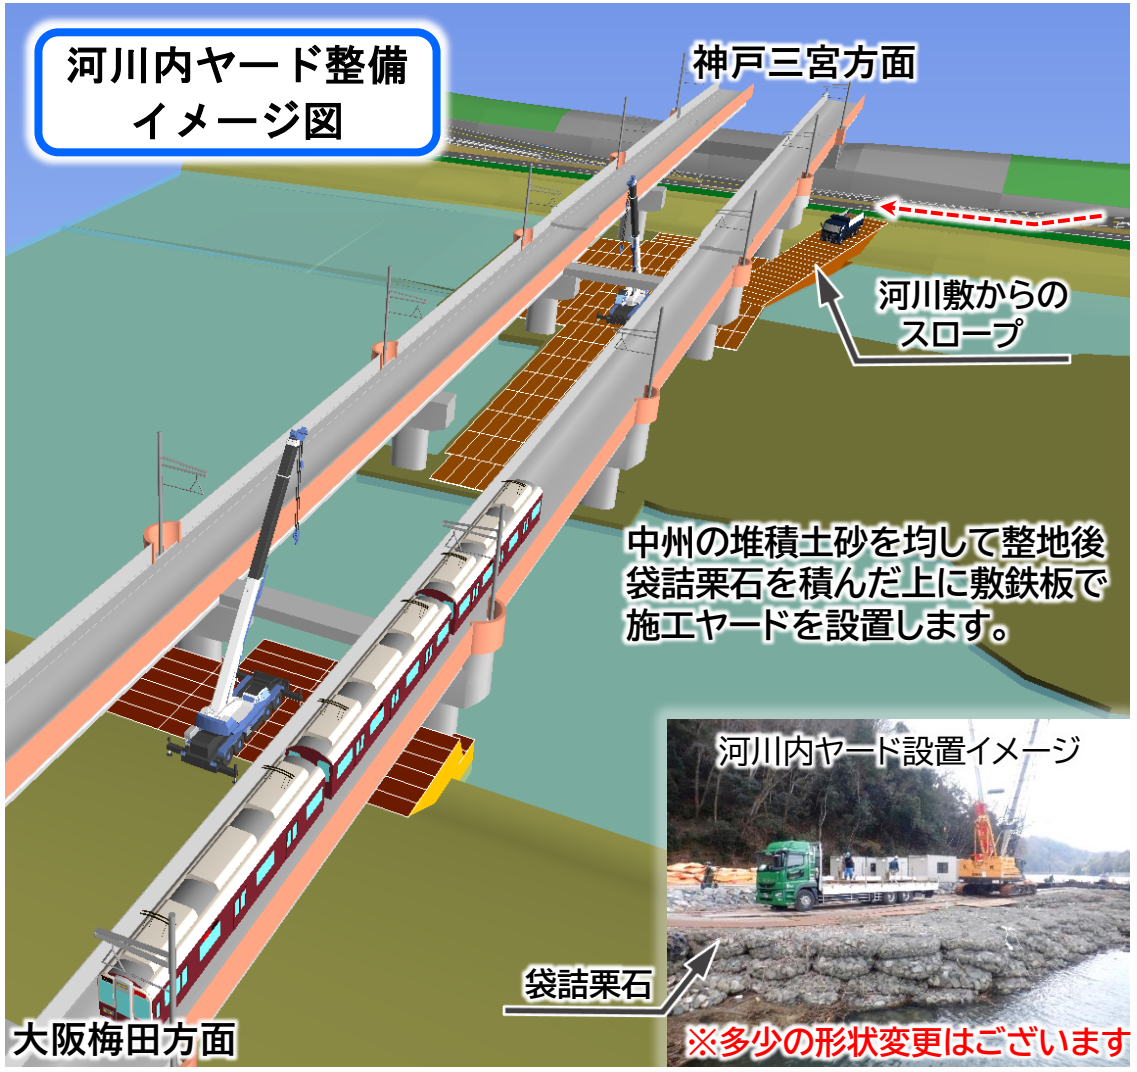

工事の流れ

STEP1

準備工事

◇河川内ヤード
◇工事用ヤード 整備工事

STEP2

橋桁工事


◇ホーム・連絡通路 橋桁工事
◇ホーム受梁工事
◇橋台（基礎）工事

STEP3

駅施設・設備工事

◇エレベーター・エスカレーター工事
◇駅舎・ホーム工事

STEP2　橋桁工事（橋台基礎・ホーム受梁工事）

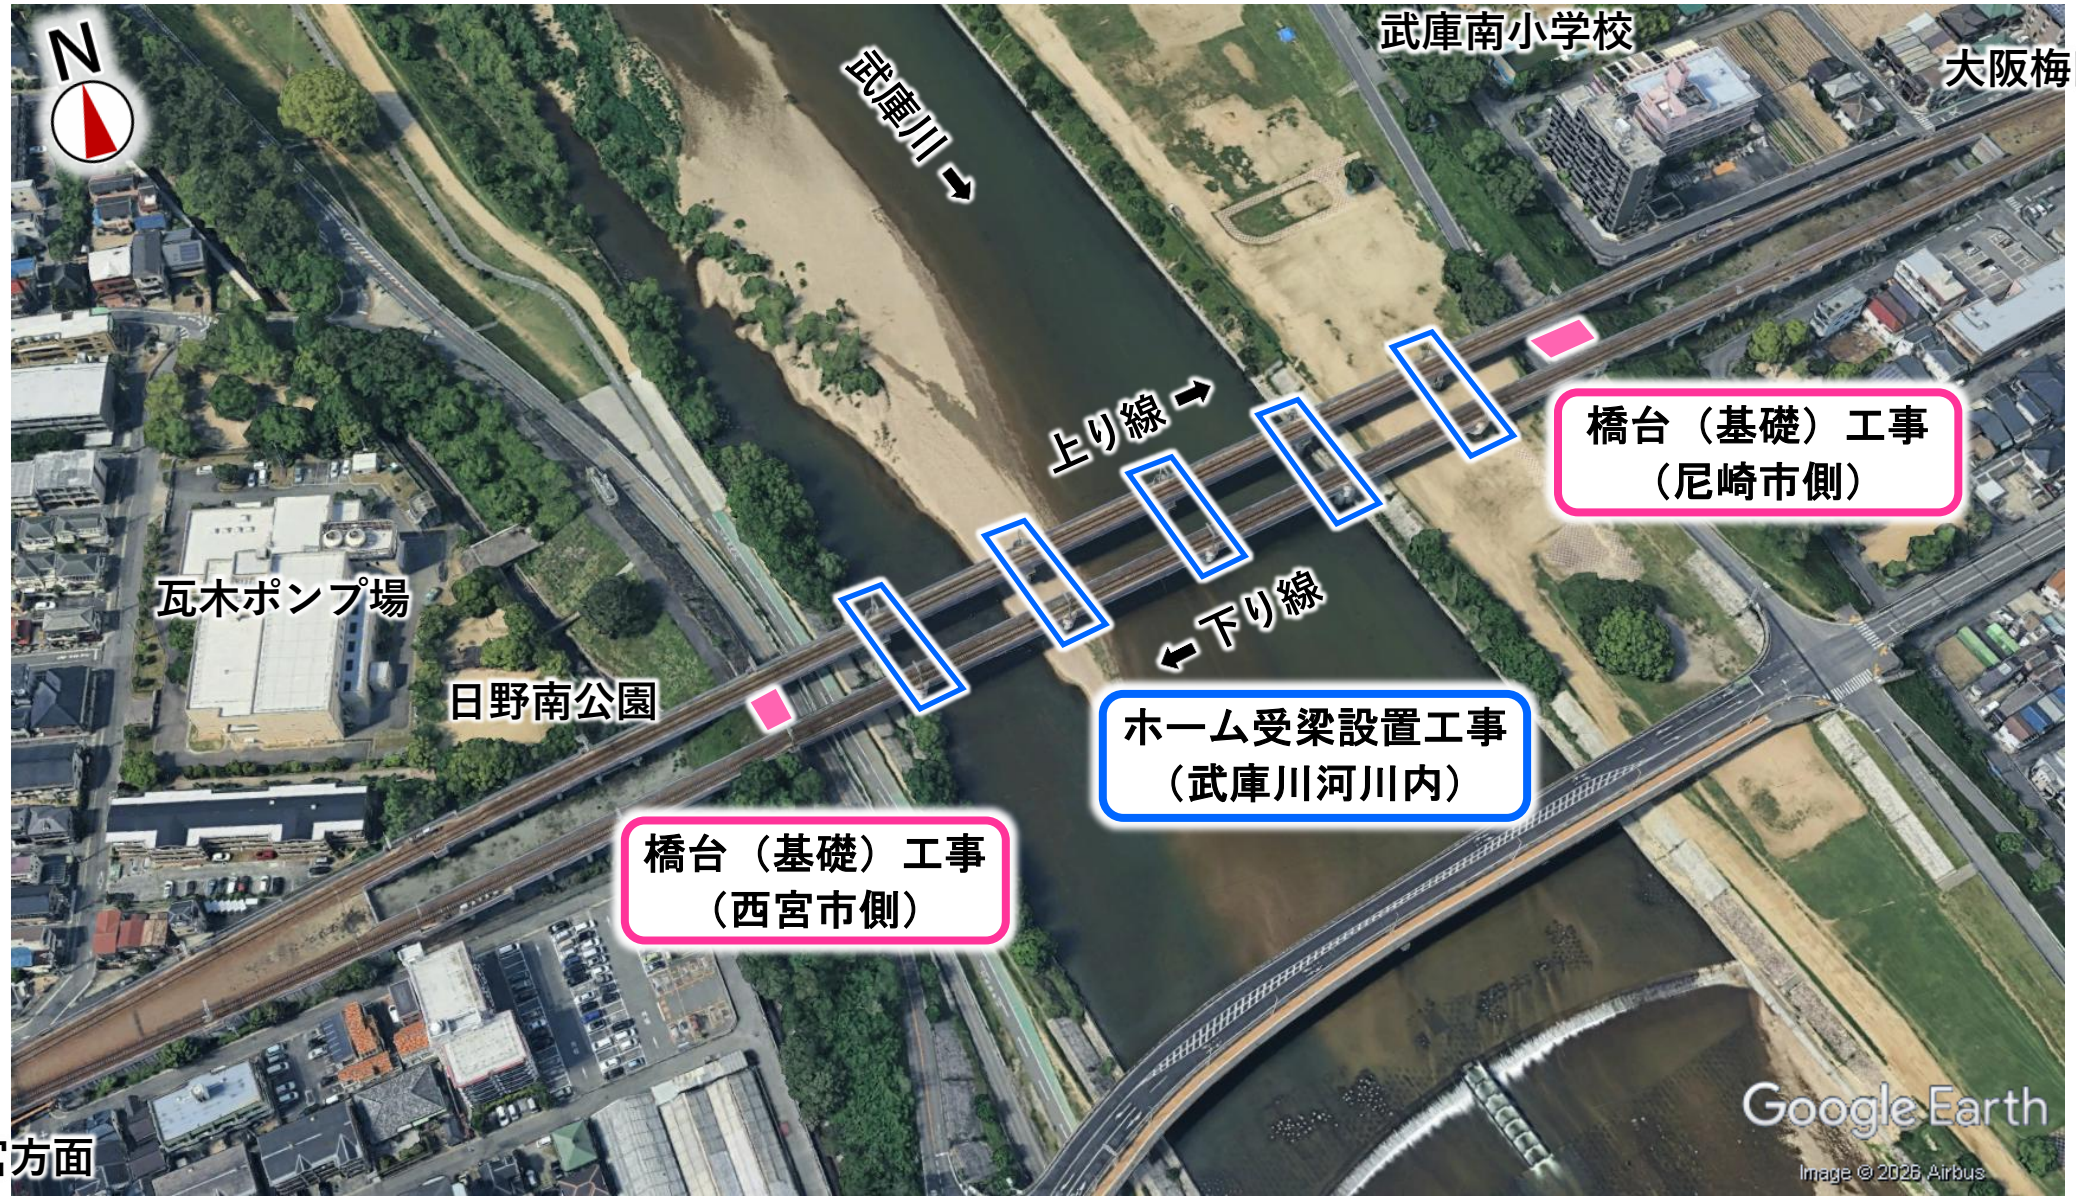


主な工事内容

武庫川左岸（尼崎市道219号線）


STEP2　橋桁工事　◇橋台工事に伴う市道219号線の交通規制について（尼崎市側）

河川敷側擁壁撤去（①）　張ブロック撤去（②）
片側交互通行規制範囲

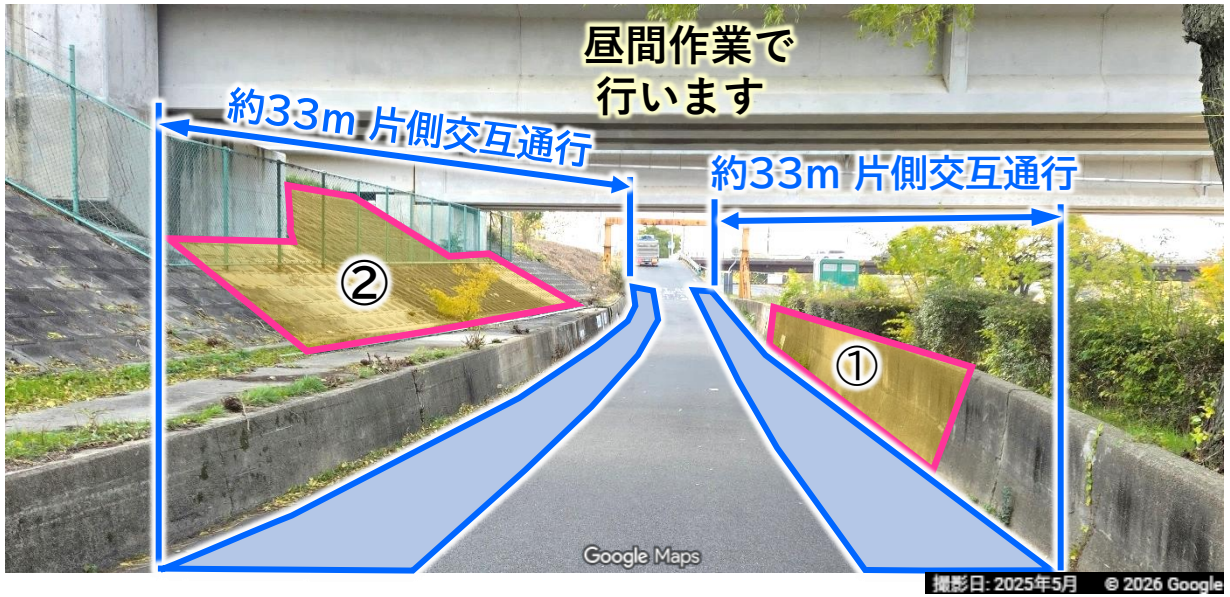


① 河川敷側擁壁撤去・復旧中は、片側交互通行（北行き規制）を行います。
◇ 撤去：2026. 11月上旬～11月中旬
◆ 復旧：2027.　5月中旬～5月下旬 ※予定
② 張りブロック撤去・復旧中は、片側交互通行（南行き規制）を行います。
◇ 撤去：2026. 11月中旬～12月末
◆ 復旧：2027.　4月下旬～ 5月中旬　※予定

① 片側交互通行（北行き33m）

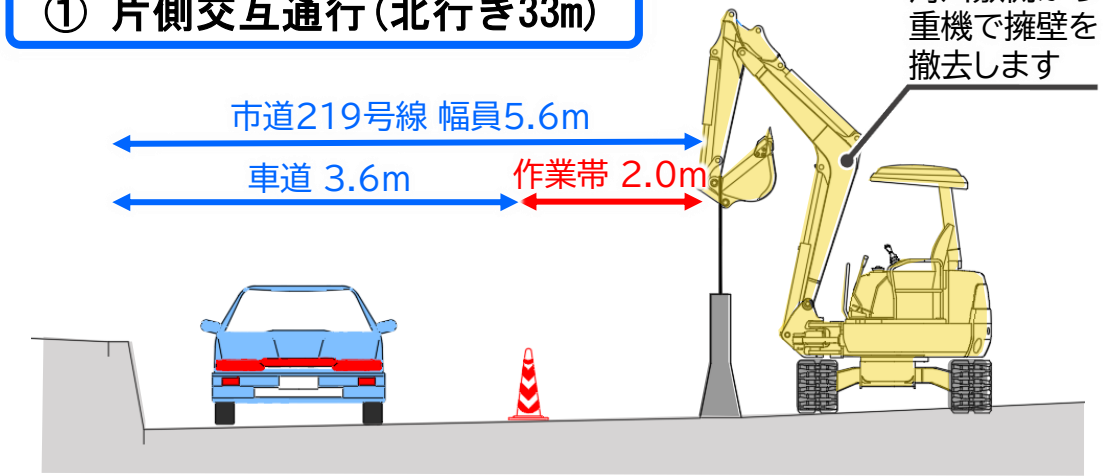


② 片側交互通行（南行き33m）

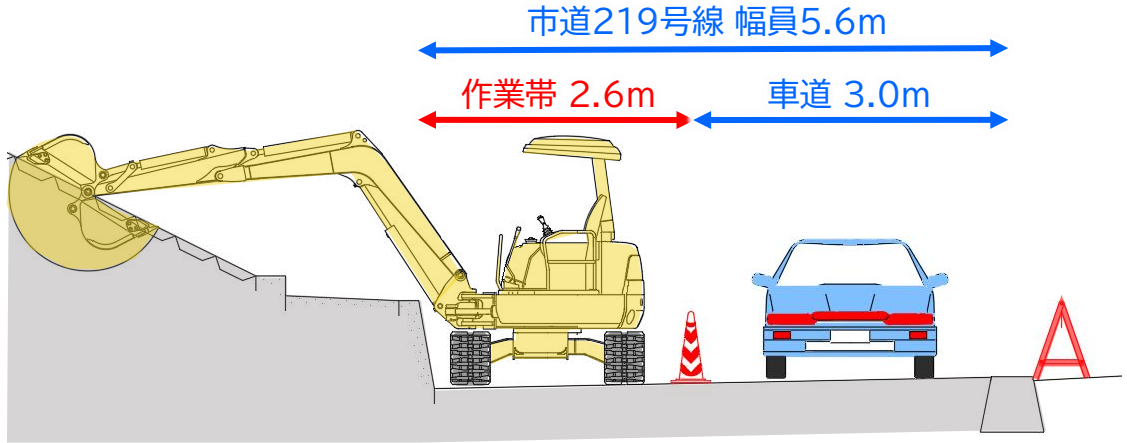

主な工事内容

武庫川左岸（尼崎市道219号線）

STEP2　橋桁工事　◇橋台工事について（尼崎市側）

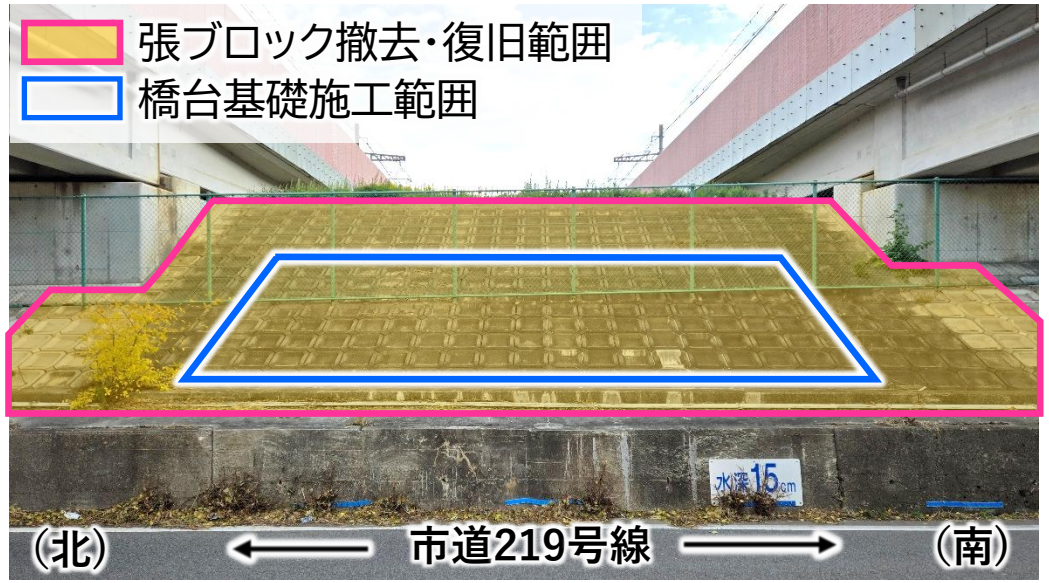



橋台基礎工事
イメージ図

橋台基礎工事は尼崎市道219号線上に大型クレーンを設置しての作業となるため、上武庫橋東詰から北に約540mの区間が夜間通行止め（21時～翌5時）となります。


期間：2027年2月中旬～2027年3月末（予定）
（約1.5ヶ月）




主な工事内容

武庫川右岸（県道114号線）

STEP2　橋桁工事　◇橋台工事について（西宮市側）

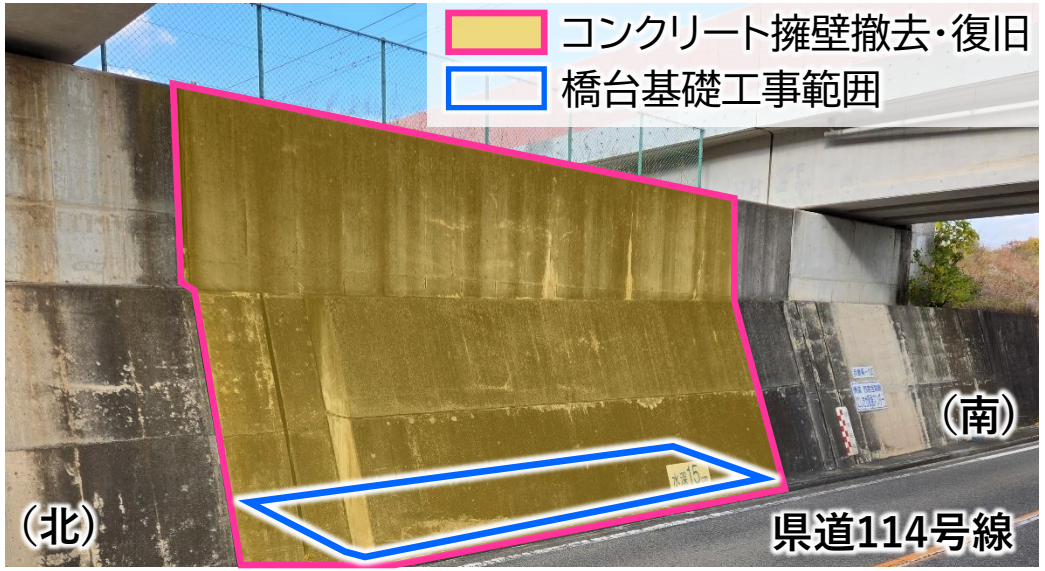

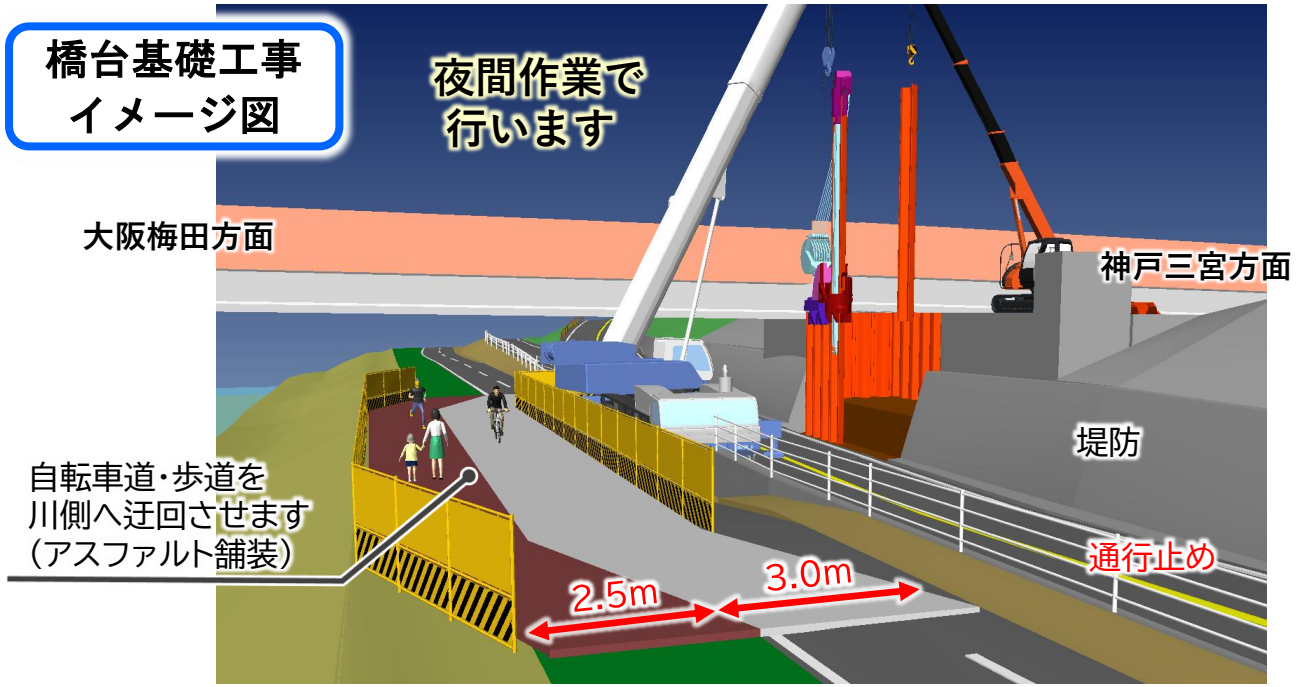


橋台基礎工事は兵庫県道114号線上に
大型クレーンを設置しての作業となるため、
上武庫橋西詰から北に約350mの区間が
夜間通行め（21時～翌5時）となります。
期間：2027年12月中旬～
2028年1月中旬（予定）（約1.5ヶ月）






主な工事内容

STEP2　橋桁工事　◇ホーム受梁工事について（武庫川河川内）

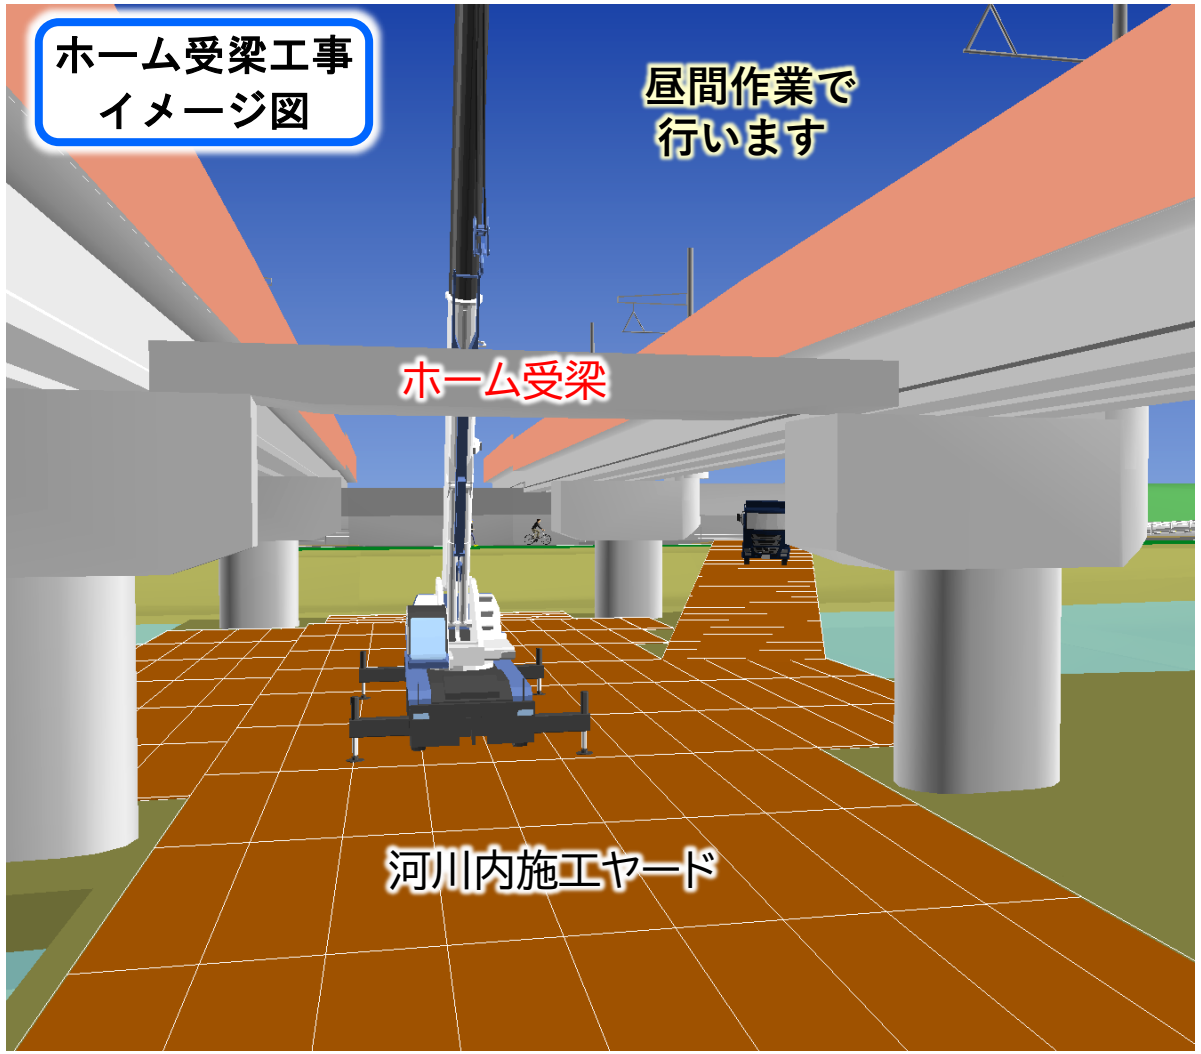

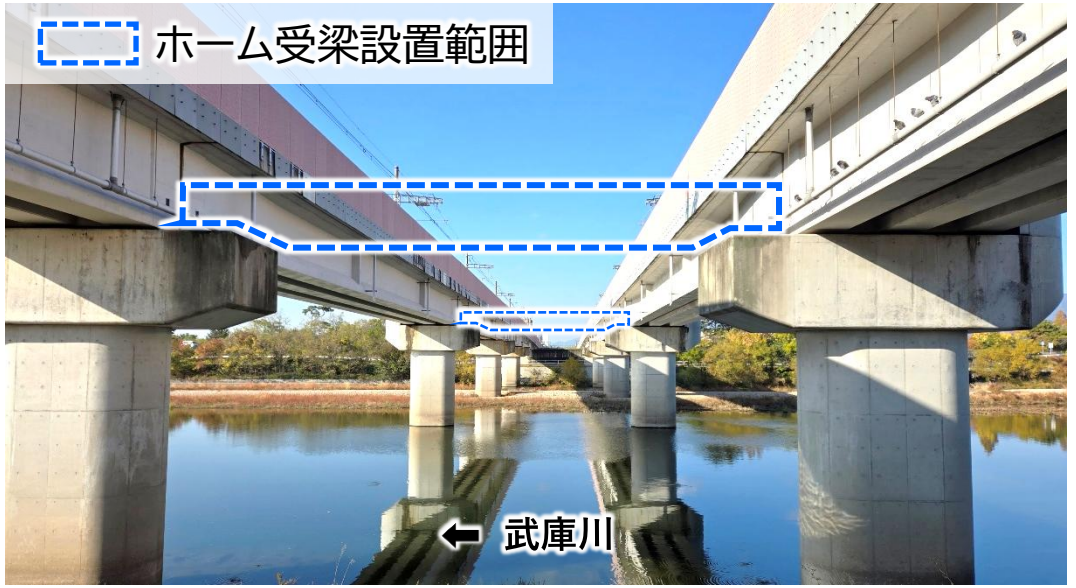

STEP2　橋桁工事（ホーム・連絡通路橋桁工事）



大阪梅田方面

神戸三宮方面


主な工事内容

STEP2　橋桁工事　◇ホーム・通路 橋桁工事について(武庫川河川内)

尼崎市側工事用ヤードに、送り出し構台を設置し
ホーム桁、通路桁を接続しながら、西宮方向に送り出します。

送り出し架設工事は昼間作業（8時～17時）となります。（一部作業を除く）

橋桁架設工事（送出し工法）完了のイメージ図

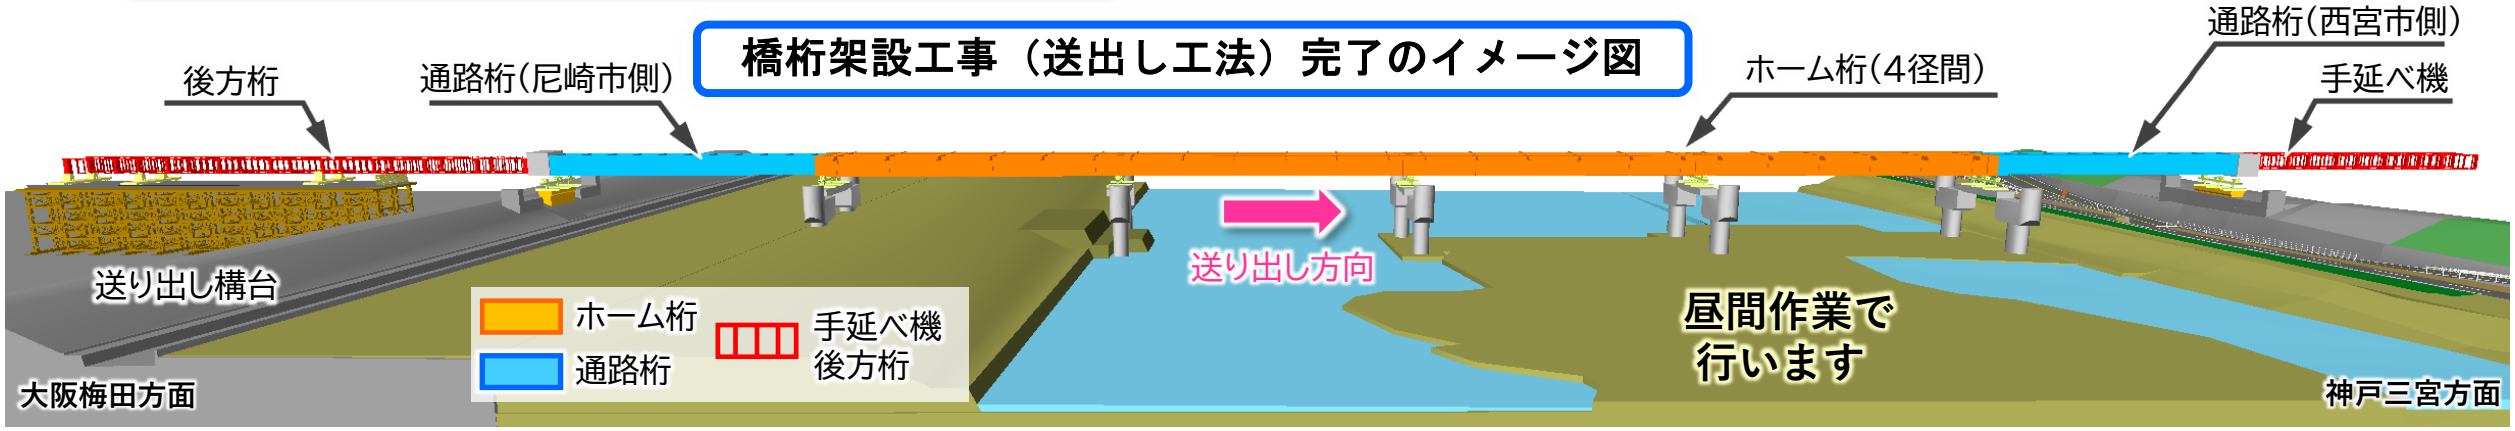

橋桁架設工事（送出し工法）のイメージ




主な工事内容


武庫川左岸（尼崎市側）

STEP2　橋桁工事　◇送り出し構台設置（尼崎市側）


仮囲いフェンス
車両出入口


尼崎市側工事用ヤードに、ホーム・通路桁を送り出す設備を設置します。

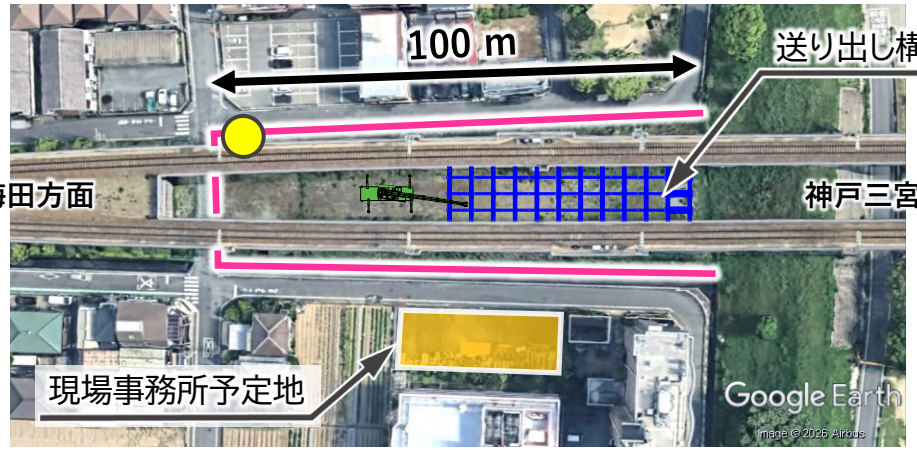

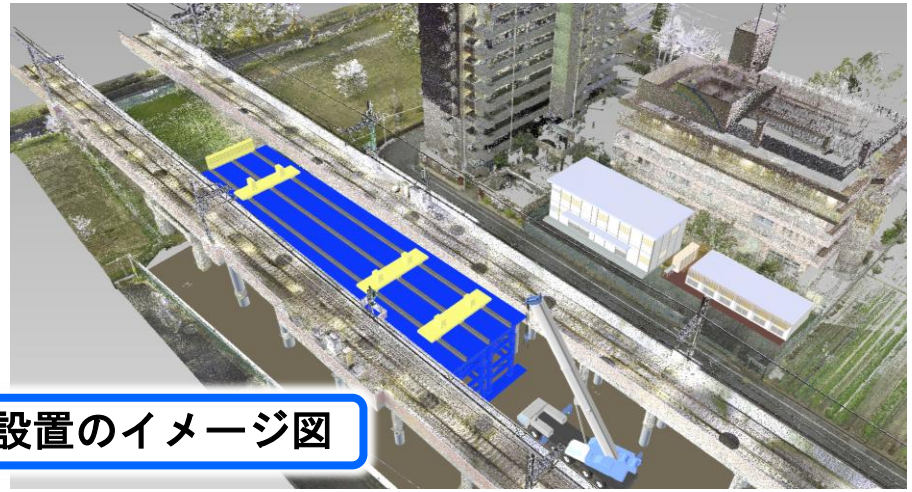

構台設置のイメージ図

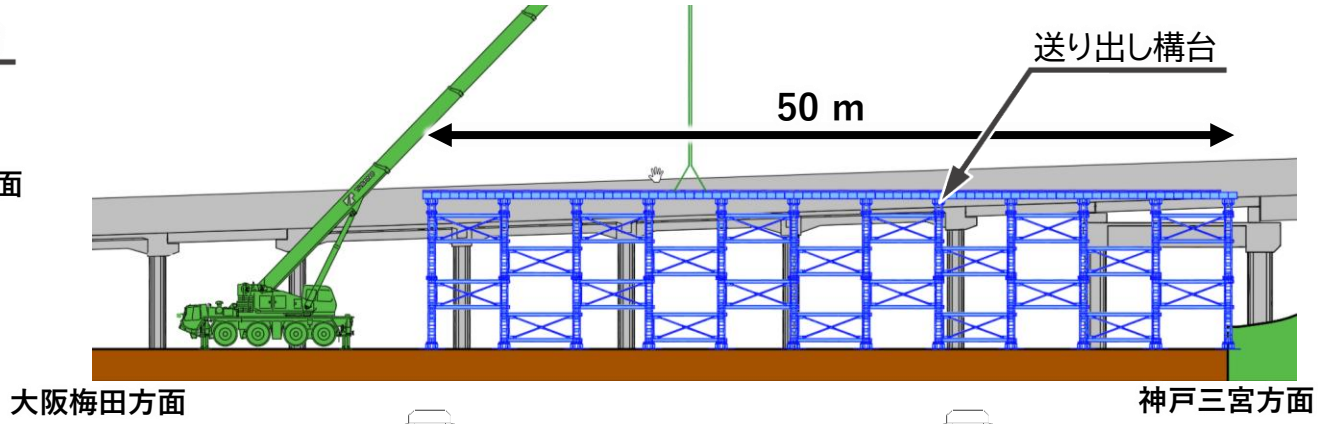

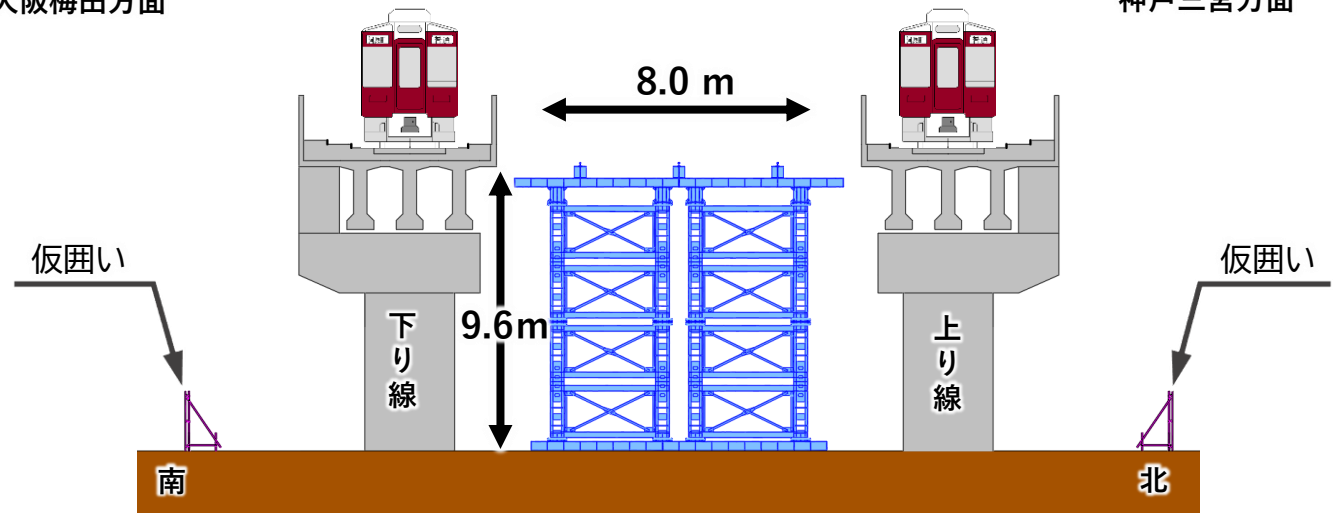

※多少の形状変更はございます

工事の流れ

STEP1

準備工事

◇河川内ヤード
◇工事用ヤード 整備工事

STEP2

橋桁工事

◇ホーム・連絡通路 橋桁工事
◇ホーム受梁工事
◇橋台（基礎）工事

STEP3

駅施設・設備工事

◇エレベーター・エスカレーター工事
◇駅舎・ホーム工事

STEP3　駅施設・設備工事





主な工事内容

武庫川河川内・尼崎市側


STEP3　駅施設・設備工事　◇ホーム・エスカレーター・エレベーター・駅舎工事


ホーム設置完了のイメージ図

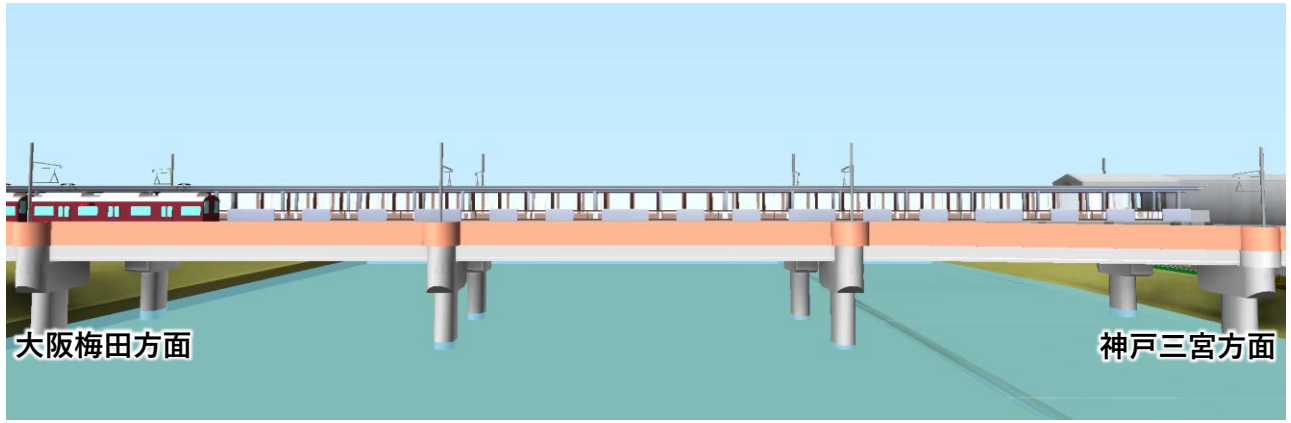

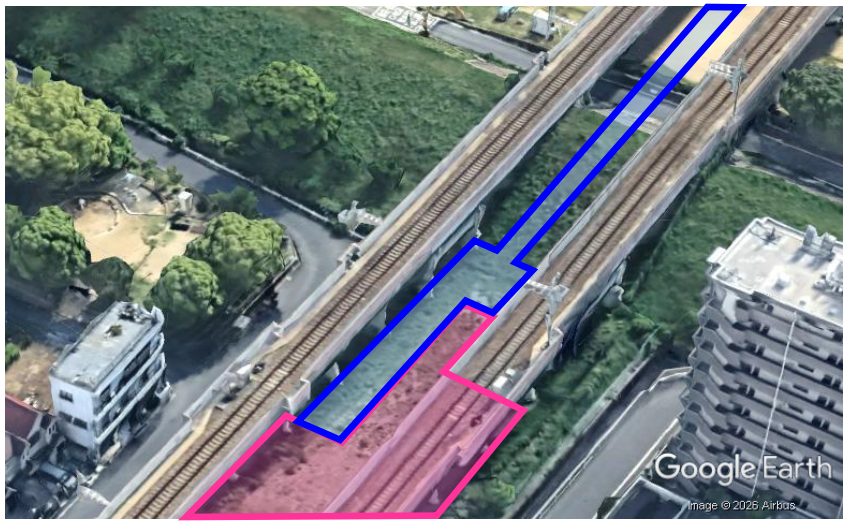

エスカレーター・エレベーター
駅舎工事範囲（尼崎市側）

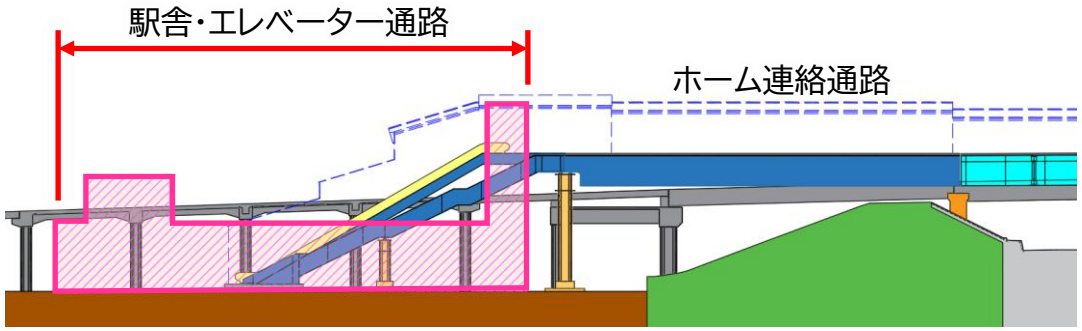


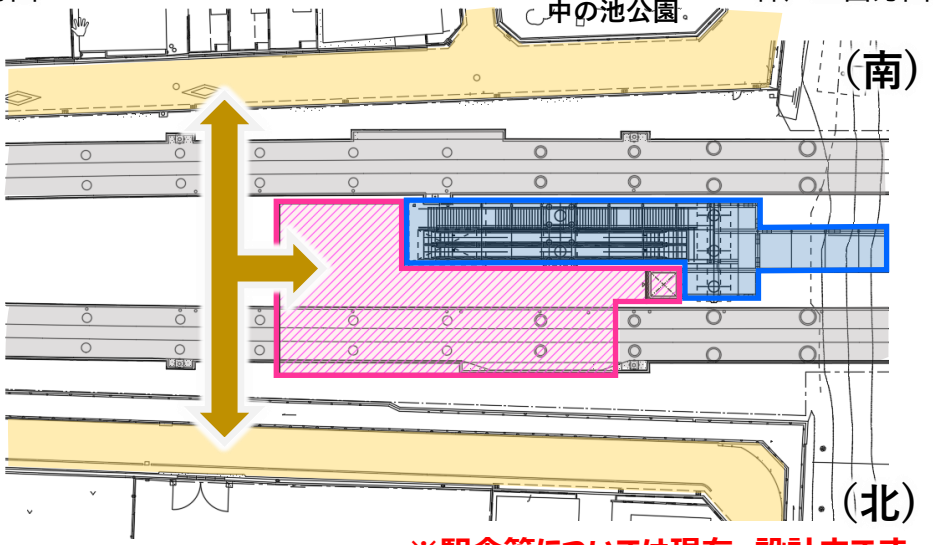

- 駅舎・EV工事範囲
- ESL・連絡通路工事範囲
- 現況市道
- 阪急神戸線高架

※駅舎等については現在、設計中です

工事工程

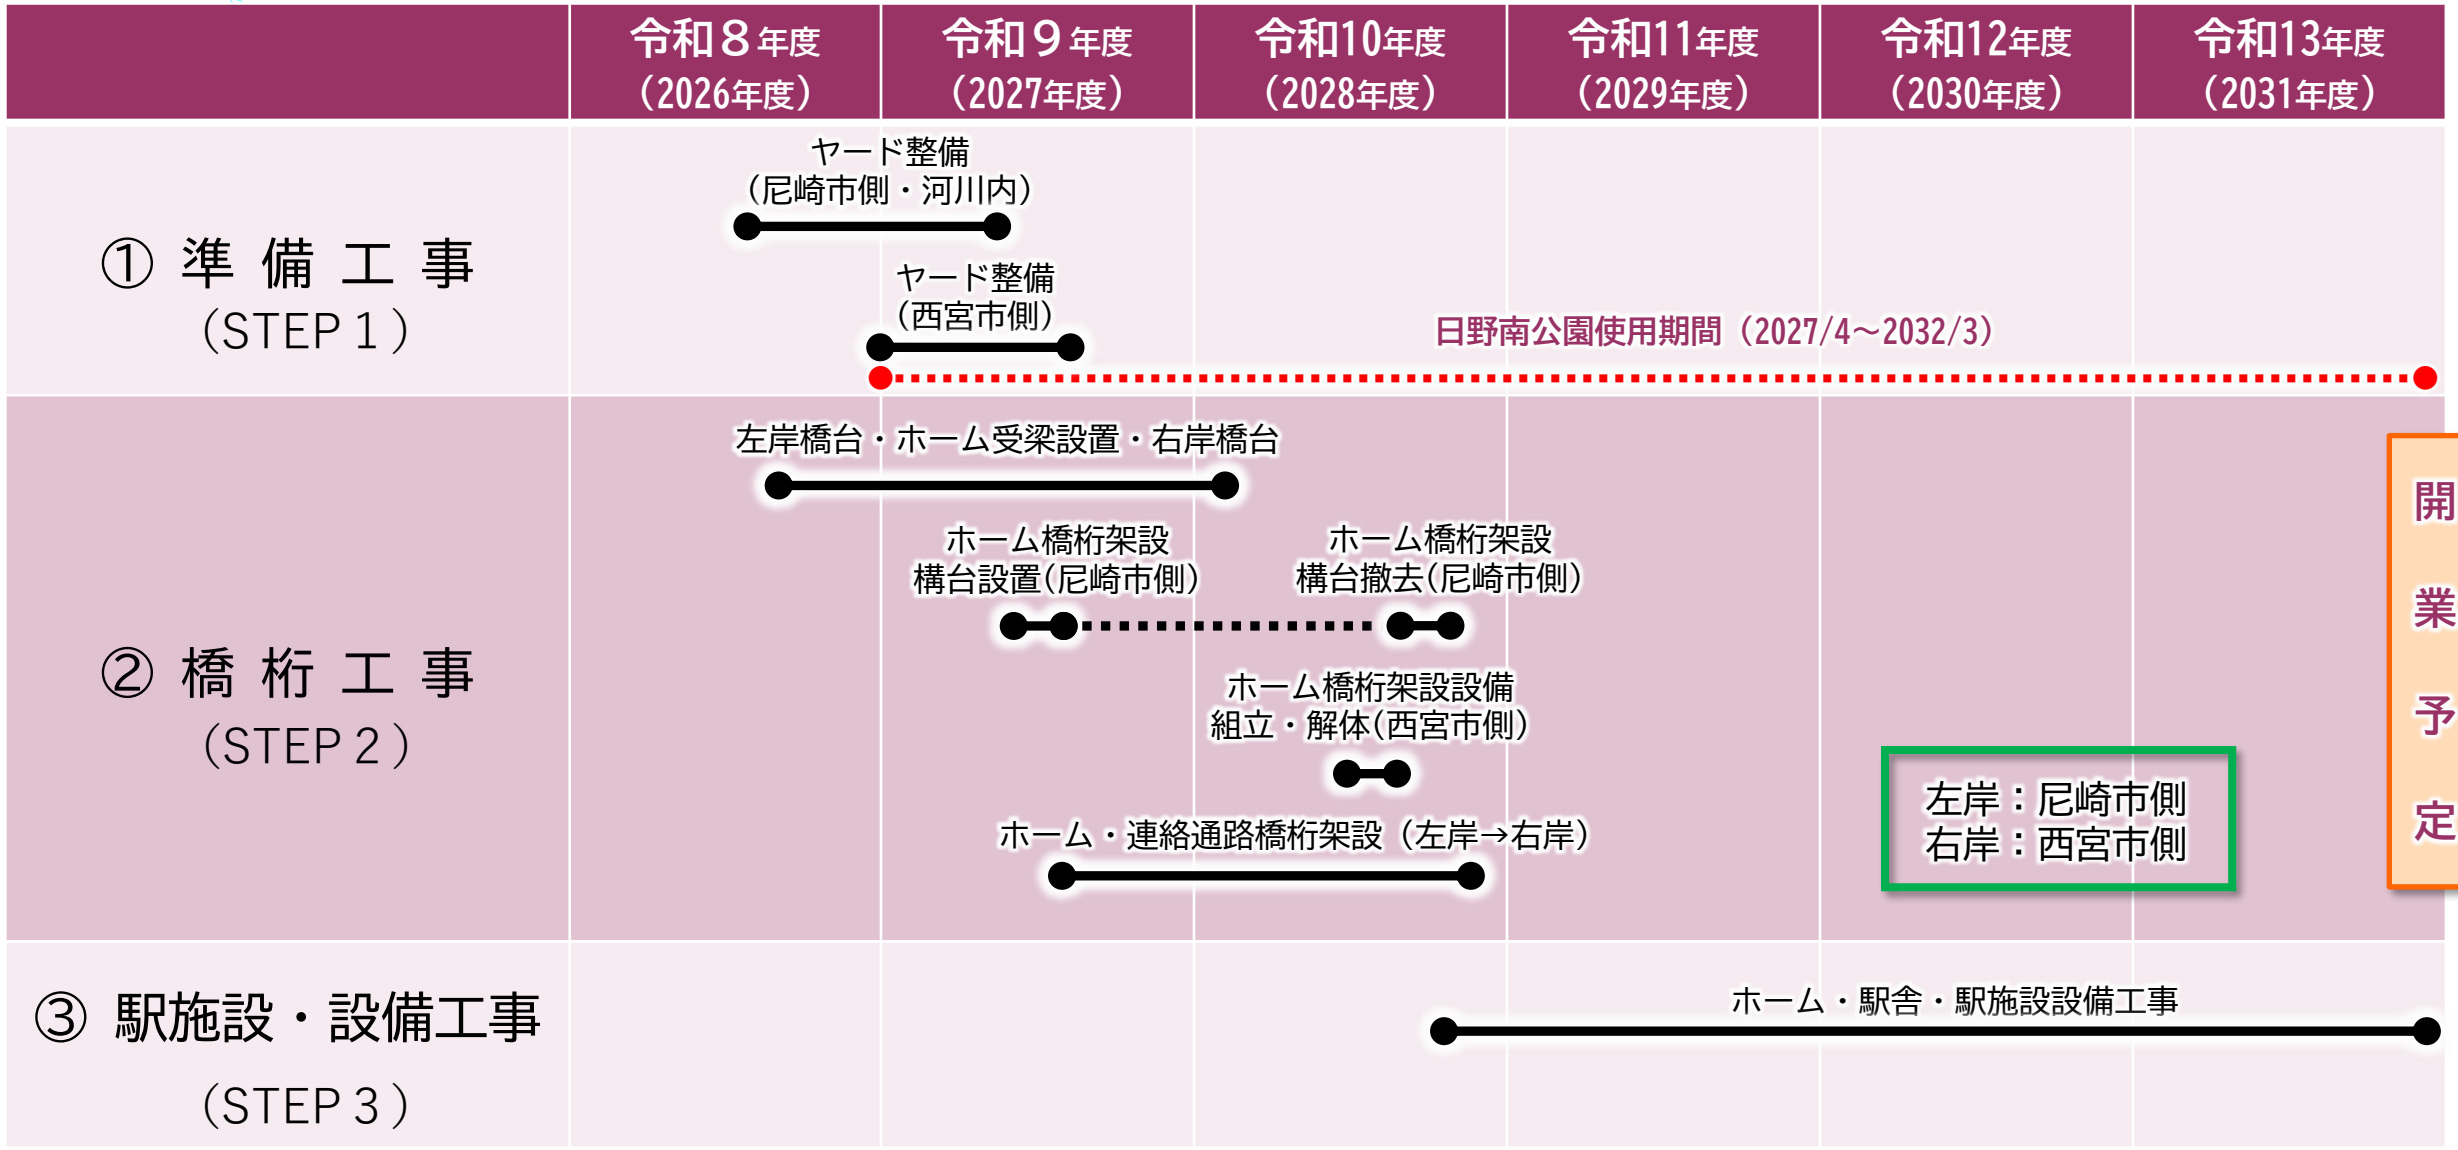


※現時点での予定であり、今後変更となる可能性があります。

§3.工事車両の通行及び安全対策

工事車両の通行ルート

施工箇所・ヤード
工事車両ルート
工事車両ルート
（現場事務所設置時）
武庫南小学校通学路
車両出入口

現場事務所設置時の工事車両運行ルートについては期間限定となります。
2026.10.1～2026.11.20（予定）

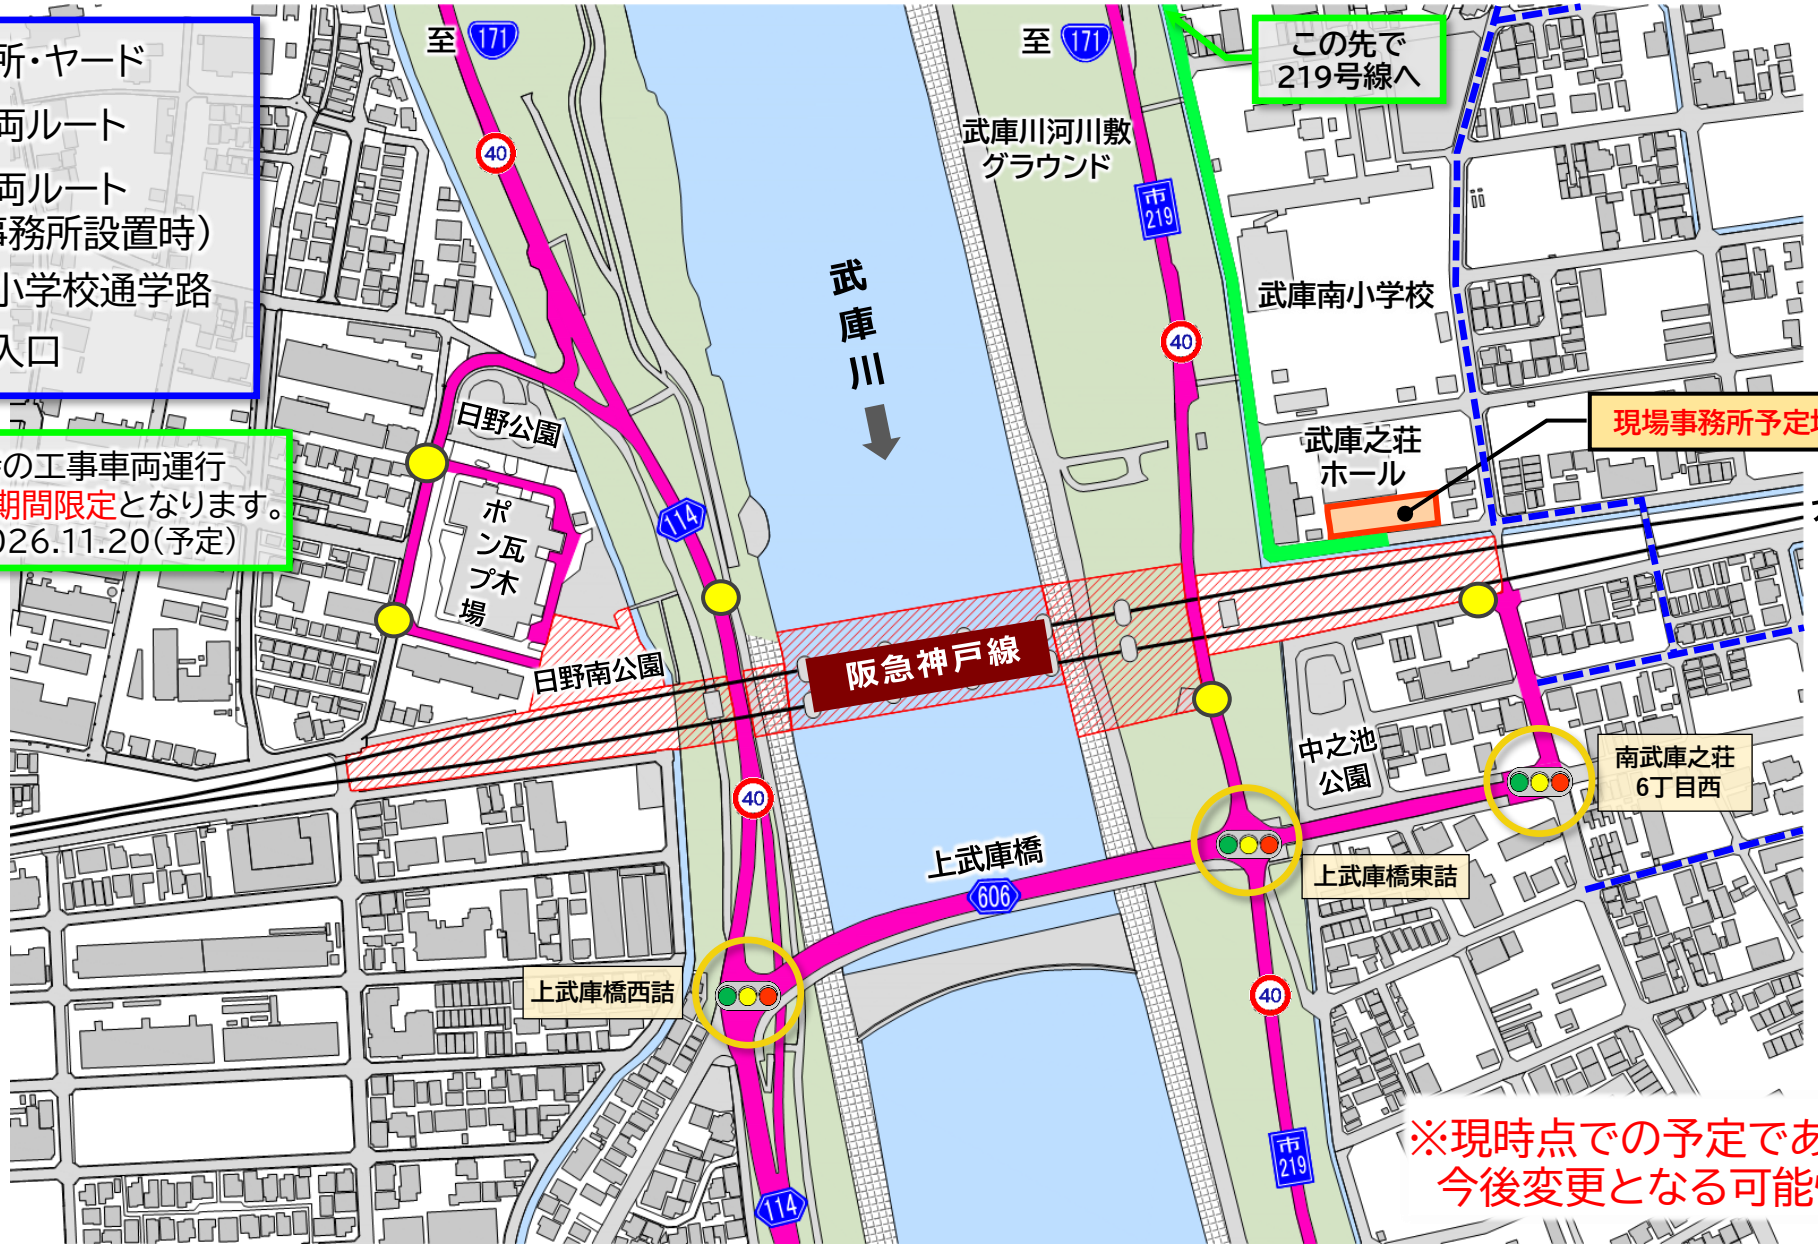


※現時点での予定であり
今後変更となる可能性があります。

工事車両証の掲出

武庫之荘～西宮北口駅間
新駅設置事業のうち土木工事

施工者：
飛島･松田特定建設工事
共同企業体

発注者：
阪急電鉄株式会社

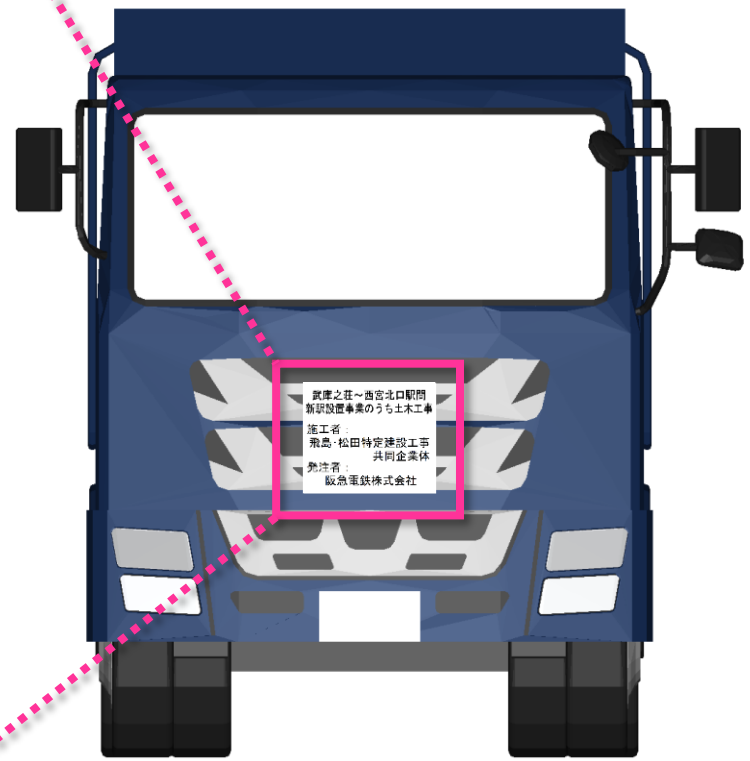

※イメージ

工事車両には工区名を記載した車両証を掲出をします

工事車両通行時の安全対策

通行経路の順守

安全運転の徹底

路上待機の禁止

一般者・一般車両優先の交通誘導

§4.周辺環境対策

周辺環境対策

仮囲い設置イメージ





・工事現場との境界には仮囲いフェンスを設置します
・見通し不良箇所は透明のパネルで視認性を確保します
・暗い場所にはLED照明などを設置し歩行者の安全確保と防犯対策を行います

周辺環境対策

周辺道路環境の保全





※イメージ

周辺道路を汚さないよう工事車両の洗浄や
現場周辺の清掃を行います

§5.作業日・作業時間帯

作業日・作業時間

作業日

月曜日～土曜日

（日曜日及び祝日は原則作業を休止します）

作業時間

昼間作業　午前８時～午後６時

※作業時間には朝礼や工事の準備・片付けなどを含みます。

※緊急時や災害時などには作業時間外や日曜日・祝日でも作業を行うことがあります。

※作業内容によってはやむを得ず夜間に行う場合（★）があります（21時～翌5時を原則とします）。


※（★）線路内・線路近接作業及び道路を規制（通行止め）して行う作業。


工事に関するお知らせ

月間工程表及び週間工程表を
工事掲示板にてお知らせします

※夜間作業を行う場合は工程表にも記載いたします
※夜間作業箇所に近接する住民の皆様にはお知らせビラを配布します

工事掲示板設置位置図（工事工程により設置箇所の変更はございます）

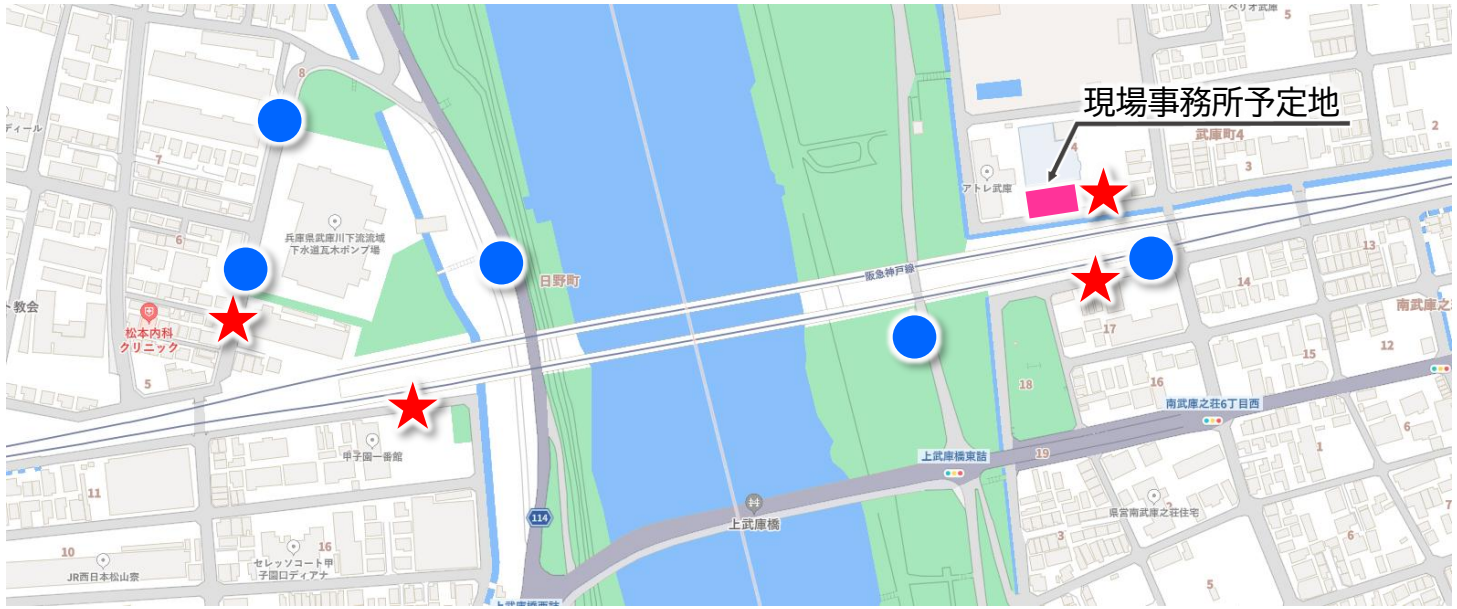

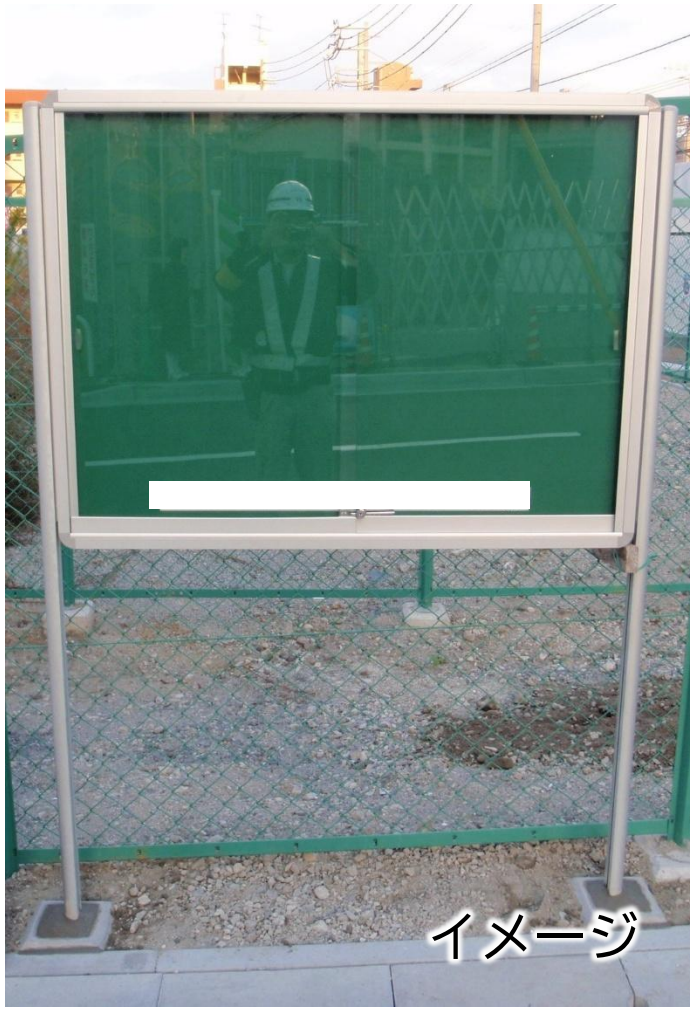

イメージ


★ 工事掲示板設置位置
● 工事車両出入口

§6.現場事務所の設置

現場事務所の設置について

工事着手に先行して、2026年10月1日より現場事務所の設置工事を行います。
（2026.10.1～2026.11.20 予定）

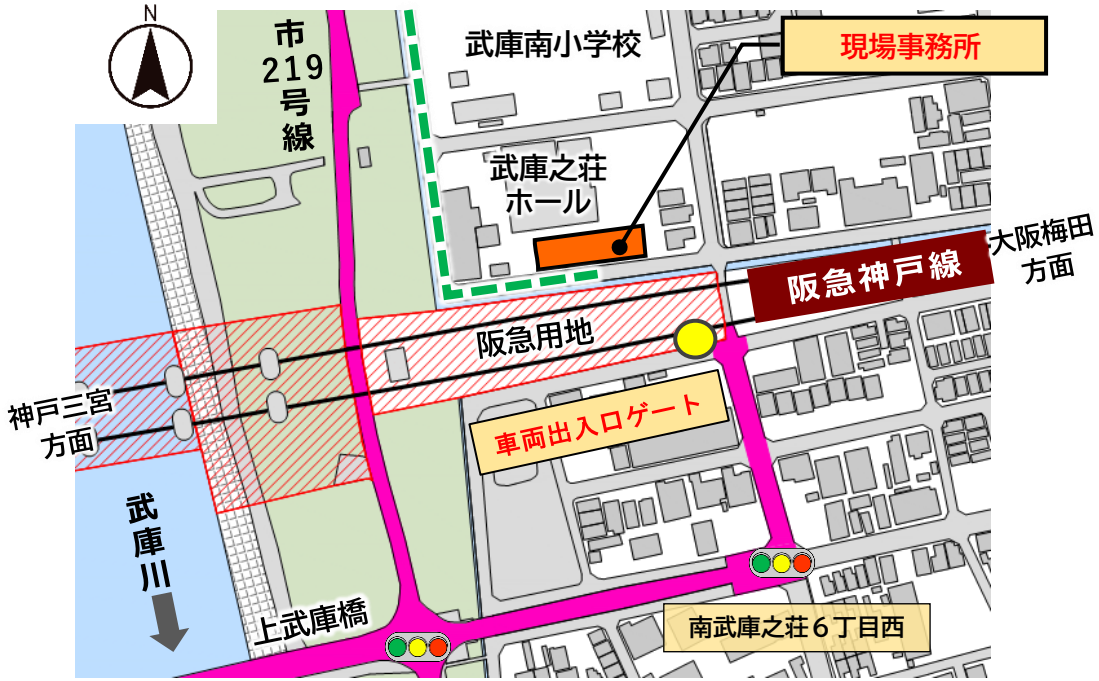

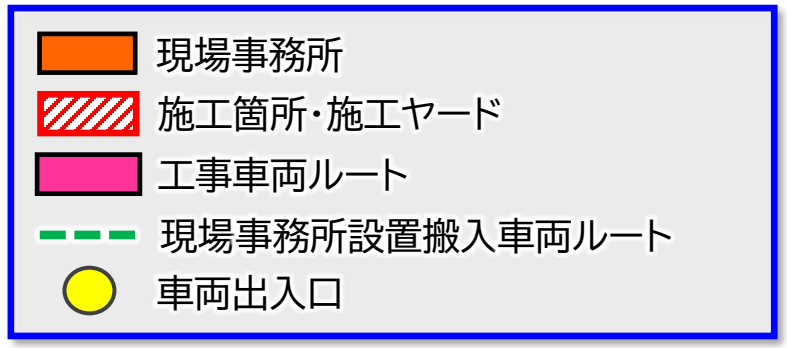

現場事務所設置イメージ図



車両出入口ゲート設置イメージ図



§7.お問合せ先

お問い合わせ先

鉄道工事に関するお問い合わせはこちら

（施工主体）阪急電鉄株式会社 交通プロジェクト推進部

TEL：06－6373－5031

（施工監理）阪急設計コンサルタント株式会社

TEL：06－6359－2752（※）

（施 工 者）飛島・松田特定建設工事共同企業体

TEL：06－6227－6600(飛島建設大阪支店)（※）

※ 現場事務所の設置後に変更予定です

お問い合わせ先

まちづくりや周辺道路整備等に関するお問い合わせはこちら

（事業者）尼崎市　都市整備局　土木部　道路整備担当

TEL：０６－６４８９－６４９３

（事業者）西宮市　都市局　都市総括室　市街地整備課

TEL：０７９８－３５－3919

§8.完成イメージパース

完成イメージパース



※本イメージは現時点のものであり、今後変更の可能性があります。

完成イメージパース



※本イメージは現時点のものであり、今後変更の可能性があります。
